CLASES 09 Y 10

Dominio de Desempeño del Equipo y Dominio de Desempeño de los Interesados

Escalera de Tuckman, organigrama, matriz RACIS, reuniones fundamentales, estructuras organizativas, registro de interesados, plan de comunicaciones y cierre administrativo

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Del Cronograma a las Personas

Hasta la Clase 08, Ana Ríos planificó y ejecutó la Plataforma de Home Banking Digital: 26 días de camino crítico (B → D → F → H → I), un presupuesto total de USD 57.750 y dos cortes de valor ganado (Días 15 y 19). Ahora falta formalizar quién hace cada cosa, quién decide y cómo se comunica.

Hoy: del cronograma al equipo y a los interesados

- **Foco de la clase:** cómo un conjunto de personas se convierte en un equipo de alto rendimiento (escalera de Tuckman), cómo se representa (organigrama), cómo se asignan las responsabilidades (matriz RACIS) y cuánta autoridad le da la estructura al director.
- **Reuniones fundamentales:** qué reuniones sostienen la dirección del proyecto y qué hace que una reunión sea útil.
- **Interesados:** a quiénes afecta la plataforma, cómo se registran y cómo se planifica, distribuye y cierra la comunicación con cada uno.
- **Correspondencia:** esta presentación cubre las Clases 8 y 9 del Cronograma DPI 2C2026 (Comunicaciones e Interesados; Recursos Humanos).
- **Próxima clase:** Taller de Recursos del Proyecto, Juicio de Experto y Matriz RACI (Cronograma, Clase 10), aplicado al proyecto de cada grupo.

MÓDULO 1

El Dominio de Desempeño del Equipo

Cultura, recursos, conceptos clave y liderazgo

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Principios, Dominios y Sistema de Entrega de Valor

PMI (2021). Guía del PMBOK®, 7.ª ed., Gráfico 3-8: los principios guían el comportamiento en los ocho dominios de desempeño

PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	**Crear un entorno colaborativo del equipo**	**Involucrarse eficazmente con los interesados**	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	**Demostrar conductas de liderazgo**	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

En magenta: los principios que se ponen en juego en los dominios de hoy.

DOMINIOS DE DESEMPEÑO

- **Interesados**
- **Equipo**
- Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida
- Planificación
- Trabajo del Proyecto
- Entrega
- Medición
- Incertidumbre

Dominio de Desempeño del Equipo

- Este dominio implica **establecer la cultura y el entorno que permita a un conjunto de diversos individuos evolucionar hasta convertirse en un equipo de proyecto de alto rendimiento.**
- Incluye el reconocimiento de las actividades necesarias para fomentar el desarrollo del equipo y alentar los comportamientos de liderazgo de todos sus miembros.
- **Interesados clave dentro de este dominio:**
  - **Director del Proyecto:** persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo del proyecto, siendo responsable de alcanzar los objetivos de este.
  - **Equipo de Dirección de Proyecto:** miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de dirección del proyecto.
  - **Equipo de Proyecto:** conjunto de individuos que realizan el trabajo del proyecto con el fin de alcanzar sus objetivos.

CASO EN CURSO

LOS TRES NIVELES EN HOME BANKING DIGITAL

Directora del Proyecto: Ana Ríos.

Equipo de Dirección: Ana junto con los líderes que coordinan cada frente (Backend / Infraestructura, Frontend, QA, Ciberseguridad y Arquitectura).

Equipo de Proyecto: todos los que ejecutan las actividades A a I del cronograma, incluido el Proveedor del SDK biométrico.

¿Cuándo el Dominio del Equipo Funciona Bien?

PMBOK 7, §2.2 (resultados deseados) y §2.2.3 (equipos de proyecto de alto rendimiento)

RESULTADOS DESEADOS

- Propiedad compartida.
- Un equipo de alto rendimiento.
- Liderazgo aplicable y otras habilidades interpersonales demostradas por **todos** los miembros del equipo.

FACTORES DE ALTO RENDIMIENTO

- **Comunicación abierta:** base de la confianza y la colaboración
- **Propiedad compartida:** apropiación de los resultados
- **Colaboración:** trabajar juntos, no aislados
- **Resiliencia:** recuperarse rápido ante fallas
- **Reconocimiento:** valorar el trabajo realizado
- **Entendimiento compartido:** propósito y beneficios en común
- **Confianza:** disposición a ir más allá
- **Adaptabilidad:** ajustar la forma de trabajo
- **Empoderamiento:** decidir sin microgestión

Una Distinción Importante

- Los **recursos físicos** incluyen el equipamiento, los materiales, las instalaciones y la infraestructura.
  - **Gestión de Recursos Físicos:** se concentra en la asignación y utilización de los recursos físicos (por ejemplo: materiales, equipos y suministros) necesarios para la exitosa finalización del proyecto.
- Los **recursos del equipo o de personal** se refieren a los recursos humanos.
- **Equipo del proyecto:** consiste en individuos que tienen asignados roles y responsabilidades, quienes trabajan en conjunto para lograr un objetivo común del proyecto:
  - Pueden tener diferentes conjuntos de habilidades.
  - Pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial.
  - Se pueden incorporar o retirar del equipo del proyecto conforme avanza el mismo.

(PMBOK, 2017)

CASO EN CURSO

RECURSOS FÍSICOS VS. EQUIPO

Recursos físicos: licencia del SDK biométrico, 8 dispositivos de prueba, entorno de staging en la nube, certificado SSL/TLS y licencia de CI/CD (inventario de la Clase 08).

Recursos del equipo: Ana, Diseño UX, Frontend, Backend / Infraestructura, el Arquitecto, QA, Ciberseguridad y los técnicos del proveedor del SDK.

QA ejecuta recién la actividad I (pruebas): un ejemplo de integrante cuya dedicación crece a medida que avanza el proyecto.

Sobre el Proceso de Adquirir los Recursos

- Los **recursos necesarios para el proyecto pueden ser internos o externos** a la organización ejecutante del proyecto.
  - Los **recursos internos** son adquiridos (asignados) por gerentes funcionales o de recursos.
  - Los **recursos externos** son adquiridos a través de los procesos de adquisición.
- **El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control directo sobre la selección de los recursos**, debido a convenios colectivos de trabajo, al uso de personal subcontratado, a un entorno de proyecto de tipo matricial, a las relaciones de comunicación interna o externa, entre otros motivos.

CASO EN CURSO

INTERNOS Y EXTERNOS EN HOME BANKING DIGITAL

Internos (asignados por la Gerencia de Tecnología y Sistemas): Diseño UX, Frontend, Backend / Infraestructura, Arquitectura, QA, Compras y Ciberseguridad.

Externos (por adquisición): Proveedor del SDK biométrico (soporte de integración en D y F).

Ana no elige a los técnicos del proveedor: los define el proveedor según el contrato. Ese límite de control se tiene que reflejar en la RACIS.

Planificación Organizacional: Personas, Empoderamiento e Integración

PMBOK 7, Guía, §3.3.3: adaptación del involucramiento de las personas en el proyecto

- **Personas:** evaluar las aptitudes y capacidades de la dirección y del equipo, y decidir quién participa y en qué capacidad. En un proyecto difícil o con tiempos ajustados conviene asignar miembros más experimentados.
- **Empoderamiento:** escoger qué responsabilidades y decisiones locales se transfieren al equipo. Algunos entornos sostienen alto empoderamiento; otros requieren más supervisión y dirección.
- **Integración:** el equipo puede combinar personal de la organización patrocinadora con entidades contratadas y socios comerciales; hay que diseñar cómo se integran para un rendimiento óptimo.
- La planificación organizacional es la decisión previa sobre quién participa, con cuánta autonomía y cómo se integra.

CASO EN CURSO

EMPODERAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN HBD

Alto empoderamiento: ante el cuello de botella en Code Review (Clase 08), el equipo de Backend decidió sumar un segundo revisor, con datos de flujo de valor.

Menor empoderamiento: la verificación biométrica adicional pedida por Seguridad se escaló al CCB (Clase 06), porque afectaba alcance, cronograma y costo.

El nivel de empoderamiento se ajusta según el riesgo y el alcance de la decisión.

Conceptos Clave

- **Actividades de dirección:** se centran en los medios para cumplir los objetivos del proyecto, como procesos eficaces, planificación, coordinación, medición y supervisión del trabajo.
- **Actividades de liderazgo:** se enfocan en las personas, abarcando influenciar, motivar, escuchar y habilitar al equipo del proyecto.
- **Rol:** la función asumida por o asignada a una persona en el ámbito del proyecto. Ejemplos de roles en un proyecto son el arquitecto de software, el analista de QA y el líder técnico.
- **Autoridad:** los derechos de asignar recursos, tomar decisiones, firmar aprobaciones, aceptar entregables e influir sobre otras personas para llevar a cabo el trabajo del proyecto.
- **Responsabilidad:** las tareas asignadas y el trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto a fin de completar las actividades de este.
- **Competencia:** la habilidad y los conocimientos requeridos para completar las actividades asignadas dentro de las restricciones del proyecto.

CASO EN CURSO

ROL, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Rol: Líder de QA.
Responsabilidad: ejecutar las pruebas de integración y usabilidad (I).
Competencia: automatización de pruebas y criterios de seguridad OWASP.

Autoridad: la firma del contrato con el proveedor del SDK no es suya ni de Ana: requiere la firma del sponsor. Autoridad y responsabilidad no siempre coinciden en la misma persona.

Autoridad, Poder y Liderazgo

El Estándar para la Dirección de Proyectos (PMBOK 7), principio "Demostrar comportamientos de liderazgo"

- **Autoridad:** posición de control otorgada a una persona dentro de la organización; es el derecho a ejercer el poder. Suele delegarse por medios formales, como el acta de constitución o un título designado.
- **La autoridad por sí sola es insuficiente:** se necesita liderazgo para motivar a un grupo hacia un objetivo común y alinear los intereses individuales con el esfuerzo colectivo.
- **Liderazgo:** actitud, talento, carácter y comportamientos para influir en las personas hacia los resultados deseados. Cualquier miembro del equipo puede ejercerlo.
- **Poder:** la autoridad formal es una fuente de poder, pero la capacidad real de influir también nace de la experiencia, la confianza y el estilo de liderazgo. PMBOK 7 no propone una clasificación cerrada de tipos de poder.

CASO EN CURSO

AUTORIDAD FORMAL Y LIDERAZGO EN ANA RÍOS

Autoridad formal: antes de la firma del Project Charter (Clase 03), Ana no tenía autoridad ni presupuesto. Con la firma, el sponsor le delega la facultad de convocar al equipo y reservar infraestructura.

Liderazgo: frente al cuello de botella en Code Review, Ana no impuso una solución desde el cargo: facilitó que el equipo la encontrara. Eso es liderazgo servicial, no una atribución del cargo.

Dirección y Liderazgo: Centralizados o Distribuidos

PMBOK 7, §2.2.1 y principio "Crear un entorno colaborativo del equipo" (§3.2)

- **Centralizados:** la rendición de cuentas (ser responsable de un resultado) suele asignarse a una persona, como el director del proyecto. El acta de constitución lo habilita a formar el equipo.
- **Distribuidos:** las actividades de dirección se comparten en un equipo de dirección, o el equipo se auto-organiza. Aparece el líder servicial, que facilita, remueve impedimentos y protege al equipo de distracciones.
- **En ambos casos,** las actividades de liderazgo deberían ser puestas en práctica por todos los miembros del equipo.
- **Acuerdos del equipo:** parámetros de comportamiento y estándares de trabajo que el equipo establece al comienzo y que evolucionan a medida que trabaja en conjunto.

CASO EN CURSO

¿CÓMO SE DIRIGE HOME BANKING DIGITAL?

La dirección es centralizada en Ana Ríos: el Project Charter firmado por el sponsor la autoriza a formar el equipo.

Aun así, cada líder conduce su frente: ante el cuello de botella en Code Review (Clase 08), el propio equipo de Backend decidió sumar un segundo revisor sin esperar que Ana decida cada detalle.

Autoridad del Director del Proyecto según la Estructura Organizacional

Recapitulación de la Clase 01 (influencias organizacionales, PMBOK 6), con la estructura de Home Banking Digital resaltada

Estructura	Autoridad del director del proyecto	Personal asignado al proyecto	Dedicación y rol del director
Funcional	Poca o nula	Virtualmente ninguno	Parcial · Coordinador
Matricial débil	Limitada	0 % a 25 %	Parcial · Coordinador
Matricial balanceada	Baja a moderada	15 % a 60 %	Completa · Director de proyecto
Matricial fuerte (Home Banking Digital)	**Moderada a alta**	**50 % a 95 %**	**Completa · Director de proyecto**
Proyectizada	Alta o total	85 % a 100 %	Completa · Director de proyecto

MÓDULO 2

Desarrollo del Equipo: Escalera de Tuckman


Cómo un grupo de personas se convierte en un equipo de alto rendimiento

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Escalera de Tuckman: Etapas de Desarrollo del Equipo

PMBOK 7, §4.2.6.1: formación, turbulencia, normalización y desempeño; muchos autores agregan una quinta etapa, la disolución

No es lineal: los equipos pueden avanzar y retroceder entre etapas, y no todos llegan a la normalización o al desempeño.

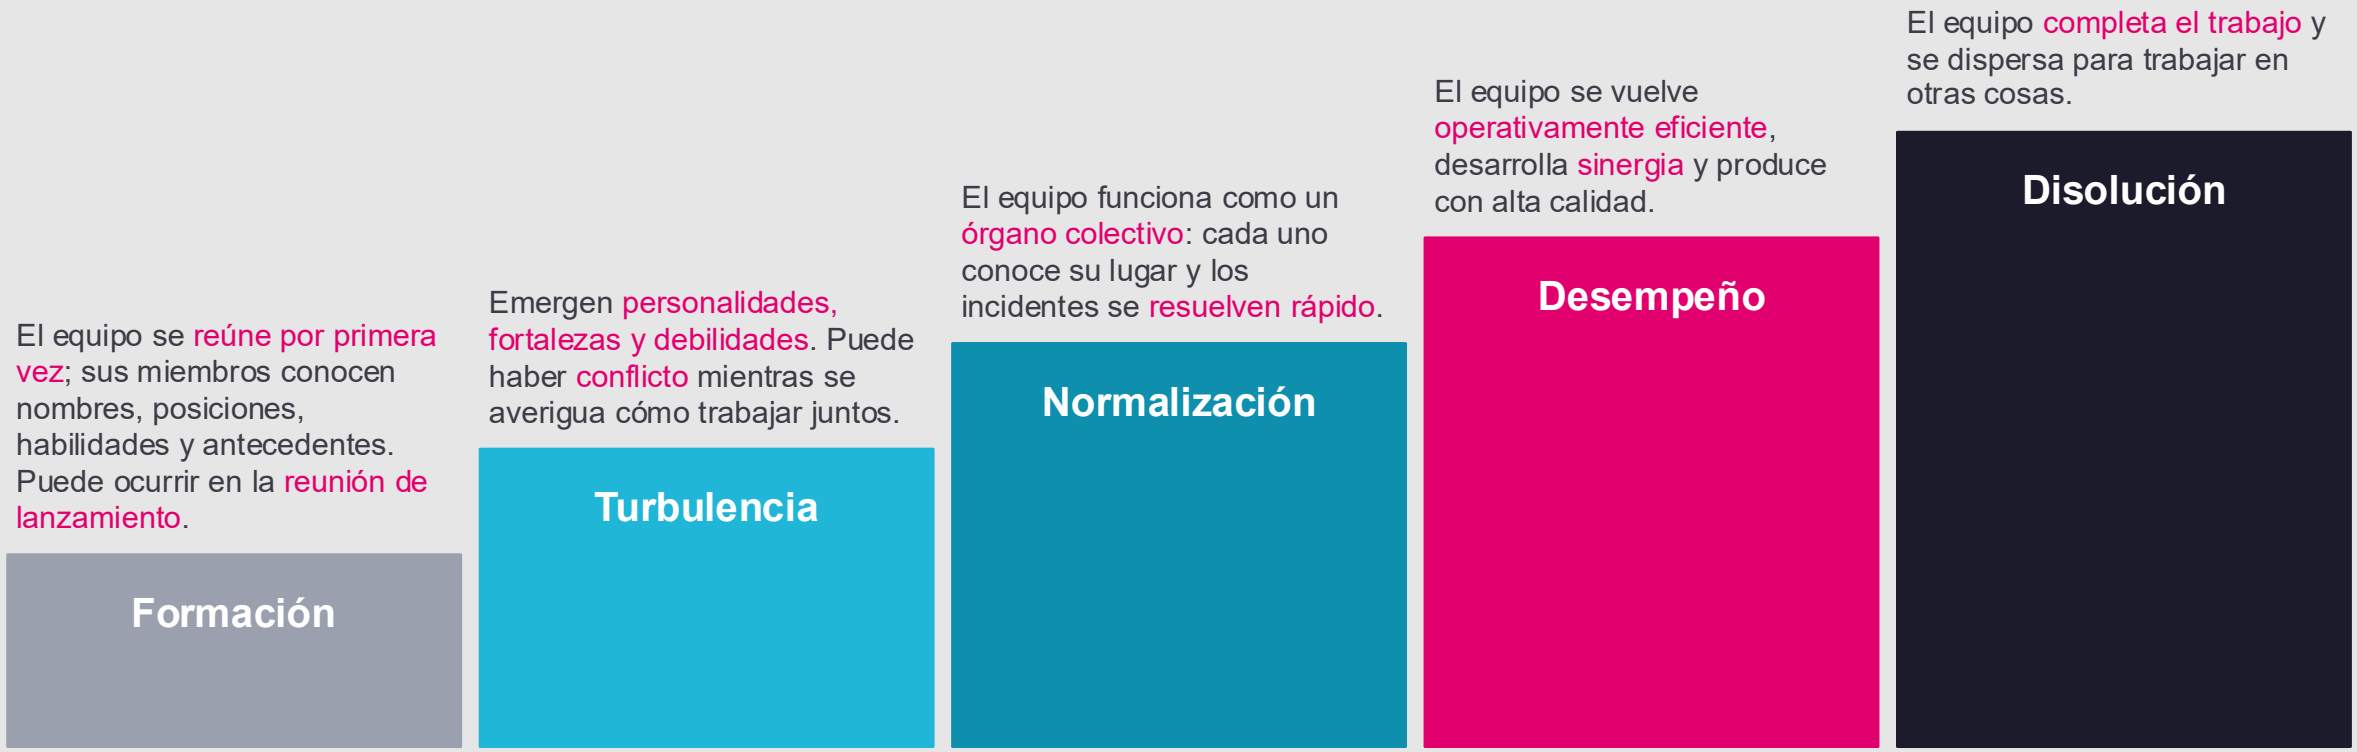

¿Qué Trayectoria Espera Ana para su Equipo?

Caso en curso: trayectoria planificada sobre el cronograma de 26 días (Clase 04)

Etapa	Momento previsto del proyecto	Señal esperada	Acción de liderazgo de Ana
Formación	Reunión de lanzamiento tras la firma del Project Charter (día 0)	Diseño, Frontend, Backend, QA y Ciberseguridad nunca trabajaron juntos en un canal digital, y se suma un proveedor externo	Presentar visión, organigrama y RACIS; construir los acuerdos del equipo
Turbulencia	B y D: selección del proveedor y desarrollo de la autenticación	Tensión entre Ciberseguridad y Diseño UX por la cantidad de pasos de verificación frente a la experiencia de usuario	Facilitar el conflicto con datos y hacer explícito quién decide (la A de la RACIS)
Normalización	Inicio de F y G en paralelo	Daily standup y reunión de estatus estables; RACIS validada	Delegar en cada líder las decisiones de su frente
Desempeño	F, G y C en paralelo, convergencia en H	El equipo resuelve sin escalar cada decisión	Remover impedimentos y proteger al equipo (liderazgo servicial)
Disolución	Hito M: certificación PCI-DSS (día 26)	Traspaso de la plataforma a operaciones	Lecciones aprendidas y reconocimiento del equipo

MÓDULO 3

Artefactos Clave: Organigrama y Matriz RACIS

Quién integra el proyecto y quién hace, decide, opina, se informa y firma

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Artefactos Clave en el Dominio de Desempeño del Equipo: Organigrama del Proyecto

- Es la **representación gráfica de los miembros del equipo del proyecto y de sus relaciones de comunicación**.
- Dependiendo de las necesidades del proyecto, puede ser **formal o informal, muy detallado o formulado de manera general**.
- **Solo muestra a los integrantes del proyecto**.

CASO EN CURSO

QUIÉN ENTRA Y QUIÉN NO

Entran: Ana, los líderes internos y el externo que ejecuta trabajo del cronograma (Proveedor del SDK biométrico).

No entran: el BCRA, el Directorio del Banco, Operaciones del Core o los usuarios finales. Son interesados, no integrantes: su lugar es el registro de interesados.

Organigrama del Proyecto: Plataforma de Home Banking Digital

Caso en curso: responsables tomados de la lista de actividades de la Clase 04 (Plazos)



Los responsables de cada actividad son los de la lista de actividades A a I y el hito M de la Clase 04 (Plazos).

Artefactos Clave en el Dominio de Desempeño del Equipo: Matriz RACIS

PMBOK 7, §4.6.6: la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM); la RACI es su formato más común y la RACIS agrega la firma

- Es un tipo de **Matriz de Asignación de Responsabilidades**.
- Es una herramienta útil **para garantizar una asignación clara de funciones y responsabilidades** cuando el equipo está compuesto de recursos internos y externos.

R — **Responsible** → persona responsable de ejecutar la tarea

A — **Accountable** → persona con responsabilidad última sobre la tarea

C — **Consult** → persona a la que se consulta sobre la tarea

I — **Inform** → persona a la que se debe informar sobre la tarea

S — **Sign** → persona que debe firmar documentación relacionada con la tarea

Matriz RACIS: Estructura

Tareas en las filas, roles en las columnas; en cada celda, la letra que define la participación del rol

Tareas \ Roles	A	B	C	D	E	F	…
Requerimientos	S	R	A				
Funcionamiento	S		A				
Diseño	S		R	A	I		
Desarrollo		R	S	A		C	
Ensayos			S	C	I	A	

R: Responsible

A: Accountable

C: Consult

I: Inform

S: Sign

Artefactos Clave: ¿Está Correctamente Desarrollada? (1)

La siguiente Matriz RACIS ¿está correctamente desarrollada? SI/NO ¿Por qué?

Matriz de roles y responsabilidades	Director Mkt	Analista Mkt	Desarrollador web
Definir el presupuesto total	A, S	R	C
Generar el contenido del sitio	A	R	I
Contactar al diseñador para el armado de piezas gráficas	I	R, A	
Programación de key words		C	R, A
Controlar y aprobar la página web a ser lanzada	A	R	I

Artefactos Clave: ¿Está Correctamente Desarrollada? (2)

La siguiente Matriz RACIS ¿está correctamente desarrollada? SI/NO ¿Por qué?

Tareas \ Roles	Stakeholders	Organizador de Evento	Project Manager	Ejecutivo de Producción
Armado de Perfil de Locación	S	A	R	S
Contratar Salón	-	A	I	-
Pago	I	R	-	-
Definir Puesta en Escena	-	R	I	R
Decidir tipo y partes de escenografía a utilizar	-	I	-	R
Armado y ubicación de las partes	-		-	R
Decorado	-	R	-	I
Listado de Canciones a reproducir	-	R	-	I
Entrevista con DJ	-	I	C	I
Solicitud de equipo de Audio	-	I	-	R
Selección de Pantalla LED y Proyector	-	R	I	I
Montaje de Pantalla LED y Proyector	-	I	-	R
Prueba de Pantalla LED y Proyector	-	R	-	I
Planificación del Iluminado General	-	C	I	R
Supervisar señalización de Salidas de Emergencia	-	-	-	R
Planificación de Iluminado al Escenario	-	R	-	-

¿Cómo Validar una Matriz RACIS?

Síntesis posterior a los dos ejercicios: criterios de construcción de la cátedra

REGLAS POR FILA

- **Un único A por tarea:** si hay dos A, nadie rinde cuentas.
- **Al menos un R por tarea:** una fila sin R es una tarea huérfana.
- **S solo donde hay documentación:** contratos, órdenes de compra, actas, presupuestos aprobados.

REGLAS POR COLUMNA

- **Roles, no categorías:** "interesados" o "todos" no son roles del proyecto.
- **Leer por columnas:** una columna saturada de R o A indica sobrecarga; una vacía, un rol que sobra.
- **C e I con criterio:** el exceso de C demora decisiones; el exceso de I satura la comunicación.

Matriz RACIS del Proyecto: 10 Tareas Principales

Caso en curso: actividades A a I y el hito M (certificación PCI-DSS) del cronograma de la Clase 04

Tareas \ Roles	Sponsor	Ana Ríos (PM)	Diseño UX	Compras	Frontend	Backend / Infra	Arqui-tecto	QA	Ciber-seg.	Prov. SDK
A: Diseño UX/UI (Figma)	C	A	R		C			C		
B: Selección de proveedor biométrico	S	A		R		R		I	C	
C: Desarrollo Portal Web (React)		A	C		R	C		I		
D: Desarrollo servicio de autenticación		A				R		C	C	C
E: Diseño arquitectura microservicios		A			C	C	R		C	
F: Integración con Identity Provider		A				R		I	R	C
G: Desarrollo motor de transacciones		A				R	C	I		
H: Integración API Gateway y core	I	A				R	C	I	C	
I: Pruebas de integración y usabilidad	I	A	C		C	R		R	C	I
M: Certificación PCI-DSS (hito)	**A, S**	**I**				**C**		**C**	**R**	

MÓDULO 4

Reuniones Fundamentales en la Dirección de Proyectos

El medio de comunicación primario del proyecto

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Aspectos Clave de Toda Reunión de Proyecto

PMBOK 7, §4.4.3: "Las reuniones son un medio importante para involucrar al equipo del proyecto y a los otros interesados"

- **Propósito:** para qué se convoca y qué decisión o resultado se espera.
- **Participantes:** solo quienes aportan o deciden; los roles de la RACIS orientan la convocatoria.
- **Agenda:** temas y tiempos enviados con anticipación.
- **Duración acotada:** período de tiempo preestablecido (timebox) y puntualidad.
- **Registro:** minuta con decisiones, acciones, responsables y fechas.
- **Seguimiento:** las acciones se revisan en la reunión siguiente.

CASO EN CURSO

UNA REUNIÓN QUE CUESTA CARO

Una reunión de estatus de 45 minutos con 8 líderes que se extiende al doble consume 6 horas-persona extra por semana.

En un cronograma de 26 días cuyo camino crítico (B → D → F → H → I) no tiene holgura, esas horas salen de actividades críticas. Una reunión sin propósito ni minuta es un riesgo de plazo.

Reuniones y Eventos según PMBOK 7

PMBOK 7, §4.4.3 y Glosario

Reunión	Propósito	Momento
Lanzamiento (kickoff)	Establecer formalmente expectativas, lograr entendimiento común y dar comienzo al trabajo	Inicio de proyecto, fase o iteración
Planificación	Crear, elaborar o revisar planes y asegurar el compromiso con ellos	Planificación y replanificación
Estatus	Intercambiar y analizar información sobre el progreso y el desempeño	Periódica
Comité de dirección	Interesados sénior dan dirección y deciden fuera de la autoridad del equipo	Periódica o por escalamiento
Comité de control de cambios	Revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios	Ante solicitudes de cambio
Revisión del riesgo	Analizar el estado de los riesgos existentes e identificar nuevos	Periódica
Conferencia de oferentes	Asegurar que los proveedores comprendan la necesidad de adquisición	Antes de la licitación
Revisión del proyecto	Evaluar estado y valor entregado; decidir el pase de fase u operaciones	Fin de fase o de proyecto
Lecciones aprendidas / retrospectiva	Identificar y compartir conocimientos para mejorar el desempeño	Fin de fase, iteración o proyecto
Cierre del proyecto	Obtener la aceptación final del alcance entregado	Final

ADAPTATIVOS

- **Daily standup:** progreso, intenciones y obstáculos.
- **Planificación de la iteración:** detalle y esfuerzo.
- **Revisión de la iteración:** demostrar lo realizado.
- **Refinamiento del backlog:** elaborar y repriorizar.
- **Planificación de la liberación:** plan de alto nivel.

Esquema de Reuniones del Proyecto

Caso en curso: Plataforma de Home Banking Digital

Reunión	Participantes	Frecuencia	Producto
Lanzamiento	Sponsor, Ana y líderes de cada frente	Una vez, día 0	Visión, organigrama, RACIS y acuerdos del equipo
Estatus del equipo	Ana y líderes de cada frente	Semanal (lunes, 45 minutos)	Minuta con acciones y responsables
Comité de dirección	Sponsor, Directorio (cliente) y Ana	Quincenal	Decisiones fuera de la autoridad del equipo
Reunión técnica de integración	Ana, Backend, Ciberseguridad y Proveedor SDK	Semanal durante D y F	Avance de la integración e incidencias del sandbox
Comité de control de cambios (CCB)	Sponsor, Ana y referente afectado	Ante cada solicitud	Cambio aprobado, diferido o rechazado
Revisión del riesgo	Ana y líderes de cada frente	Semanal, junto al estatus	Registro de riesgos y uso de la reserva
Cierre y lecciones aprendidas	Sponsor, Ana y equipo completo	Una vez, tras el hito M	Aceptación final y registro de lecciones

MÓDULO 5

El Dominio de Desempeño de los Interesados

Registro de interesados y plan de gestión de las comunicaciones

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Dominio de Desempeño de los Interesados

PMBOK 7, §2.1: "Los proyectos son realizados por las personas y para las personas"

- Implica **trabajar con los interesados para mantener la alineación y colaborar con ellos para fomentar las relaciones positivas y la satisfacción.**
- **Interesado:** individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio.
- **Análisis de interesados:** método que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar los intereses de quiénes deberían tenerse en cuenta.
- **Resultados deseados:** una relación de trabajo productiva; el acuerdo con los objetivos del proyecto; y que los beneficiarios estén satisfechos, mientras que quienes puedan oponerse no impacten negativamente en los resultados.

CASO EN CURSO


MÁS ALLÁ DEL EQUIPO DE ANA

La plataforma afecta a personas que no están en el organigrama:

el BCRA, que exige autenticación reforzada; el Directorio del Banco, cliente del proyecto; la Gerencia de Operaciones del Core Bancario, que custodia los sistemas que integra H; el Área de Atención al Cliente, que recibirá las consultas; y los usuarios finales, que cambiarán su forma de ingresar.

Navegar el Involucramiento Eficaz de los Interesados

PMBOK 7, §2.1.1 (Gráfico 2-3): un ciclo continuo durante todo el proyecto




Identificar	Comprender y analizar	Priorizar	Involucrar	Monitorear
De alto nivel antes de formar el equipo; detallada y continua durante el proyecto.	Sentimientos, creencias y valores; poder, impacto, actitud, expectativas, influencia, cercanía e interés.	Enfocarse en quienes tienen más poder e interés; repriorizar ante cambios.	Presentar el proyecto, obtener requisitos, gestionar expectativas, negociar y resolver incidentes.	Evaluar si la estrategia es eficaz, ajustarla y medir la satisfacción.

Es un ciclo continuo: aparecen nuevos interesados, otros dejan de serlo y cambian su actitud o su poder. El involucramiento requiere habilidades blandas (escucha activa, gestión de conflictos) y de liderazgo (visión, pensamiento crítico). El análisis de interesados debe mantenerse confidencial, porque fuera de contexto puede malinterpretarse.

Priorizar: Matriz de Poder e Interés

PMBOK 7, §2.1.1.3 indica priorizar por poder e interés; la cuadrícula con sus cuatro estrategias proviene de PMBOK 6, §13.1.2.4

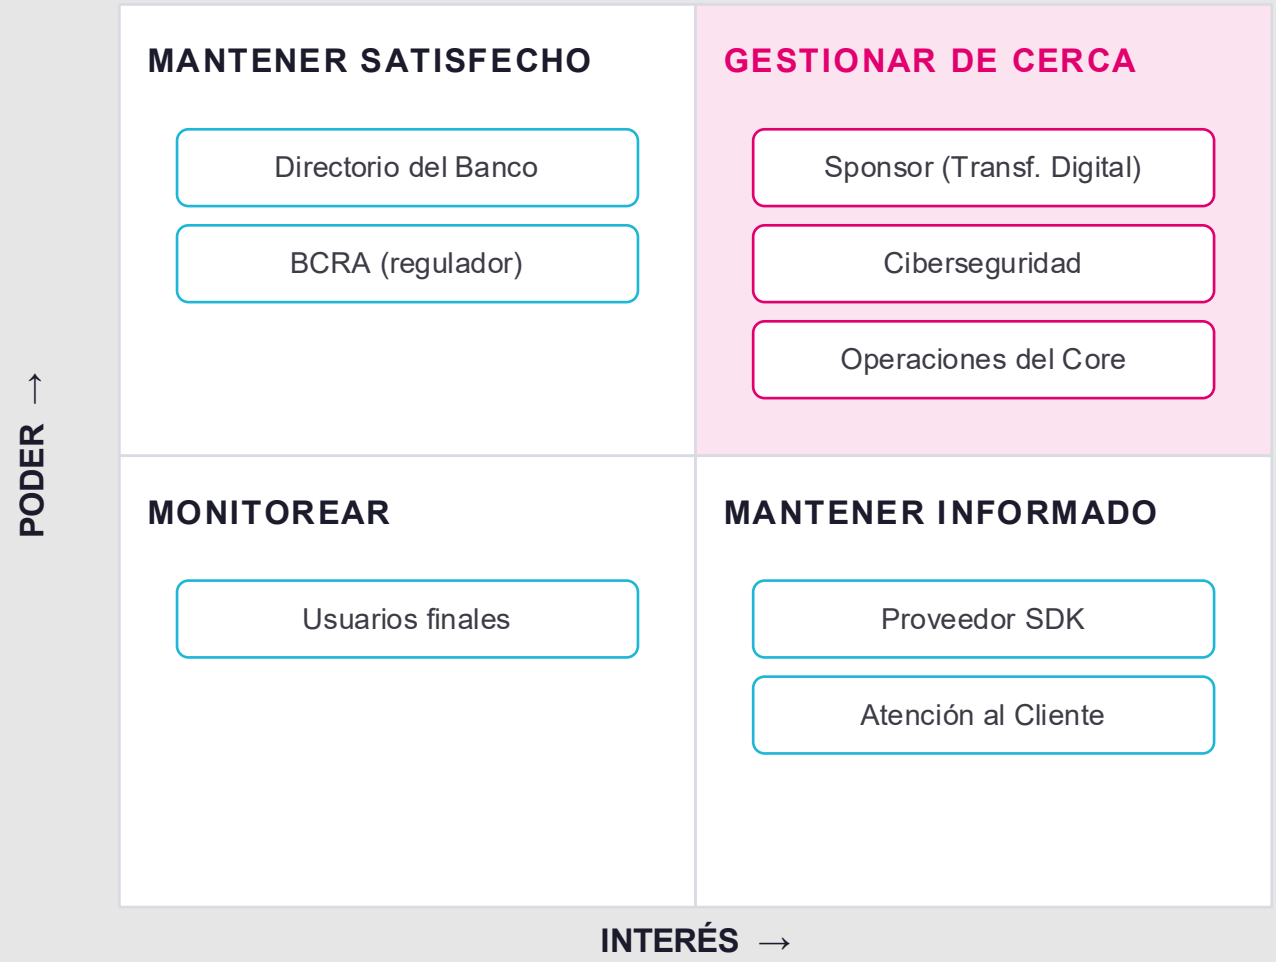

ASPECTOS A ANALIZAR

- Poder
- Impacto
- Actitud
- Creencias
- Expectativas
- Grado de influencia
- Cercanía al proyecto
- Interés en el proyecto

Analizar también las alianzas entre interesados (PMBOK 7, §2.1.1.2).

Artefactos Clave en el Dominio de los Interesados: Registro de Interesados

PMBOK 7, §4.6.2 (artefacto de bitácora y registro); contenido típico según PMBOK 6, §13.1.3.1

"Registra información acerca de los interesados del proyecto, que incluye **información, evaluación y clasificación** de los mismos." Se actualiza a lo largo de todo el proyecto.

IDENTIFICACIÓN

- Nombre o grupo
- Puesto u organización
- Rol en el proyecto
- Datos de contacto
- Interno o externo

EVALUACIÓN

- Requisitos principales
- Expectativas
- Potencial de influencia
- Fase de mayor interés
- **Actitud:** apoyo, neutral o resistencia

CLASIFICACIÓN

- Cuadrante de poder e interés
- Prioridad
- Estrategia de involucramiento
- Responsable del vínculo

Registro de Interesados del Proyecto

Caso en curso: Plataforma de Home Banking Digital (datos de contacto omitidos por espacio)

Interesado	Int./Ext.	Expectativa principal	Poder	Interés	Actitud	Estrategia
Gerencia de Transformación Digital (sponsor)	Int.	+20 % de transacciones digitales, dentro de 26 días y USD 57.750	**Alto**	**Alto**	Apoyo	Gestionar de cerca
Gerencia de Operaciones del Core Bancario	Int.	Que la integración con el core (H) no afecte la estabilidad transaccional	**Medio**	**Alto**	**Resistencia**	Gestionar de cerca
Ciberseguridad	Int.	Autenticación reforzada y pruebas OWASP sin hallazgos críticos	**Alto**	**Alto**	Apoyo	Gestionar de cerca
BCRA (regulador)	Ext.	Cumplimiento de la normativa de autenticación reforzada	**Alto**	**Bajo**	Neutral	Mantener satisfecho
Directorio del Banco (cliente)	Int.	Crecimiento del canal digital y reputación del banco	**Alto**	**Bajo**	Apoyo	Mantener satisfecho
Proveedor del SDK biométrico	Ext.	Especificaciones claras y pagos en término	**Bajo**	**Alto**	Apoyo	Mantener informado
Área de Atención al Cliente	Int.	Capacitación y guiones de soporte antes del lanzamiento	**Bajo**	**Alto**	Neutral	Mantener informado
Usuarios finales del home banking	Ext.	Seguir operando sin interrupciones ni pasos engorrosos	**Bajo**	**Bajo**	Neutral	Monitorear

Comunicar e Involucrar: Tipos y Métodos

PMBOK 7, §2.1.1.4 (Tabla 2-1) y §4.2.2.2 (efectividad de los canales de comunicación)

TIPOS DE COMUNICACIÓN

	Formal	Informal
Escrita	Planes, informes de estado, actas	Correos, notas, mensajes
Verbal	Presentaciones, revisiones, comités	Conversaciones, charlas ad hoc

RIQUEZA DEL CANAL

La información compleja o personal requiere canales ricos (cara a cara); la información simple y factual admite canales menos ricos (una nota, un mensaje). Los ciclos de retroalimentación rápida confirman si el mensaje fue escuchado y comprendido.

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

- **Push:** se envía a los interesados (informes, correos). Es unidireccional y no permite evaluar la comprensión: usarla deliberadamente.
- **Pull:** el interesado busca la información (intranet, repositorios). Permite detectar inquietudes de forma indirecta.
- **Interactiva:** intercambio en tiempo real (reuniones, llamadas, demostraciones). Es la base del involucramiento.

Barreras de Comunicación: Brecha de Ejecución y de Evaluación

PMBOK 7, §4.2.2.1 (comunicación intercultural) y §4.2.2.3 (modelo de Donald Norman)

- **Brecha de ejecución:** diferencia entre la intención de un usuario y lo que el elemento le permite hacer. Ejemplo de la Guía: un auto que debería estacionarse solo al presionar "estacionar" y no lo hace.
- **Brecha de evaluación:** grado en que un elemento ayuda a interpretarlo e interactuar con él. Mismo ejemplo: controles que no dejan claro cómo iniciar el estacionamiento automático.
- **Estilos y contexto del receptor:** el conocimiento, la experiencia, el idioma, el pensamiento y los estilos de comunicación del receptor, junto con los estereotipos y su relación con el emisor, influyen en cómo interpreta el mensaje.
- En proyectos, estas brechas aparecen cuando un informe se entiende distinto por quien lo escribe y por quien lo lee, sin mala intención de nadie.

CASO EN CURSO

UNA BRECHA POSIBLE EN HBD

Supongamos que el informe de estado del Día 15 (Clase 06) solo dijera "SPI 0,92".

Para el equipo técnico es un dato claro. Para el Directorio del Banco, no indica qué acción se espera de él: es una brecha de evaluación.

Se reduce acompañando el indicador con el semáforo y una lectura explícita: "el cronograma avanza al 92 % de lo planificado; se solicita una decisión del CCB".

Artefactos Clave en el Dominio de los Interesados: Plan de Gestión de las Comunicaciones

PMBOK 7, §4.6.3; contenido típico según PMBOK 6, §10.1.3.1

- Componente del plan para la dirección del proyecto que describe **cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y difundirá la información del proyecto.**
- **Responde seis preguntas:** ¿qué se comunica?, ¿a quién?, ¿para qué?, ¿cómo (push, pull o interactivo)?, ¿cuándo (frecuencia o evento disparador)? y ¿quién es responsable?
- **Se deriva del registro de interesados:** el registro dice a quién y con qué prioridad; el plan dice qué, cómo y cuándo.
- **Artefacto relacionado:** el plan de involucramiento de los interesados, que define las estrategias y acciones para promover su participación productiva.

CASO EN CURSO

UNA INCOHERENCIA FRECUENTE

Operaciones del Core Bancario figura como "gestionar de cerca" en el registro.

Si el plan solo le envía un correo semanal (push), la estrategia no se cumple: un interesado con interés alto y actitud de resistencia necesita comunicación interactiva, antes de que la integración con el core (H), que está en el camino crítico, quede bloqueada.

Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Caso en curso: derivado del registro de interesados de Home Banking Digital

¿Qué?	¿A quién?	¿Para qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Quién?
Informe de estado	Sponsor (Transformación Digital)	Avance frente a los 26 días y estado EVM (CPI, SPI)	Correo + tablero RAG (push)	Semanal, viernes	Ana Ríos
Reunión de estatus	Líderes de cada frente	Coordinar y destrabar	Presencial (interactiva)	Semanal, lunes	Ana Ríos
Comité de dirección	Sponsor y Directorio (cliente)	Decisiones y escalamientos	Reunión (interactiva)	Quincenal	Ana Ríos
Repositorio del proyecto	Equipo del proyecto	Arquitectura, contratos, cronograma y Kanban	Wiki y repositorio (pull)	Permanente	Ana Ríos
Reunión técnica de integración	Backend, Ciberseguridad y Proveedor SDK	Avance e incidencias del sandbox	Reunión + minuta (interactiva)	Semanal durante D y F	Líder de Backend
Mesa de integración con el core	Operaciones del Core Bancario	Acordar ventanas y pruebas sobre el core	Reunión (interactiva)	Semanal hasta H	Líder de Backend / Infra
Evidencia de cumplimiento	BCRA	Autenticación reforzada documentada	Documento formal (push)	En hitos regulatorios	Ciberseguridad
Aviso de nuevo ingreso	Usuarios finales	Anticipar el cambio y canal de soporte	App y correo (push)	2 semanas antes de M	Gerencia de Banca Digital

Distribución de la Información: Informes, Tableros y Radiadores

PMBOK 7, §4.6.7 (informes), §4.6.6 (datos e información visuales) y §2.7.3 (presentación de la información)

- **Informe de estado:** da cuenta de la situación actual del proyecto, con el avance desde el último informe y pronósticos de costo y cronograma. Es el nombre técnico del "reporte de desempeño".
- **Tableros:** muestran datos consolidados, frecuentemente con semáforos (rojo, amarillo y verde) para alcance, cronograma y costo.
- **Radiadores de información:** recursos visibles, de baja tecnología y actualizados con frecuencia, que todo el equipo ve sin pedirlos.
- **Controles visuales:** tableros de tareas tipo Kanban y gráficas de trabajo pendiente (burndown), que muestran el flujo de trabajo de un vistazo.

CASO EN CURSO

EL TABLERO RAG DE HBD, RELEÍDO

En la Clase 06 construimos, sin nombrarlo, un tablero de control: alcance en verde, cronograma (SPI) en amarillo y costo (CPI) en amarillo, al corte del Día 15.

El tablero Kanban de Backend, que en la Clase 08 reveló el cuello de botella en Code Review, es a la vez un control visual: comunica el flujo sin que nadie pregunte.

Cierre Administrativo

PMBOK 7, §4.4.3 (reuniones de cierre y de lecciones aprendidas) y cierre dentro del ciclo de vida del proyecto

- Al cerrar el proyecto, el conocimiento y los artefactos se archivan, los miembros del equipo son liberados y los contratos se cierran.
- **Reunión de cierre del proyecto:** obtiene la aceptación final del alcance entregado por parte del patrocinador, el dueño del producto o el cliente.
- **Reunión de lecciones aprendidas:** identifica y comparte el conocimiento adquirido para mejorar el desempeño de proyectos futuros.
- El cierre es la última instancia formal de comunicación con los interesados: por eso integra la gestión de las comunicaciones.

CASO EN CURSO

CIERRE PROYECTADO DE HBD

Cierre administrativo: Ana registra que el tiempo de entrega del proveedor biométrico (15 días) debió anticiparse desde el Charter y archiva los cortes de valor ganado.

Cierre del contrato: finiquito con el proveedor del SDK, condicionado a la certificación PCI-DSS vigente.

Disolución: Backend / Infraestructura se reasigna a otros proyectos una vez firmada el acta de aceptación.

MOMENTO DE CLASE TALLER

Home Banking Digital Durante la Integración

El relato (leer en grupos de 4)

La integración con el Identity Provider (F) comenzó hace una semana. El Líder de QA dejó el banco y su reemplazo se incorporó el lunes, sin haber participado de la reunión de lanzamiento. En la última reunión de estatus, Diseño UX y Ciberseguridad volvieron a discutir, en voz alta, quién decide cuántos pasos de verificación tiene el ingreso; la reunión se extendió el doble de lo previsto y terminó sin minuta.

Por otra parte, el sponsor le pidió a Ana que le envíe novedades todos los días por mensajería instantánea. Asimismo, una fintech de pagos firmó un acuerdo con el banco para integrar su billetera dentro del home banking y necesita definir con Backend / Infraestructura el acceso a la API Gateway. El Proveedor del SDK, en tanto, consulta a tres personas distintas y recibe respuestas diferentes.

MOMENTO DE CLASE TALLER

Consignas del Taller

Instrucciones de resolución

- **Equipo:** determinen en qué etapa de la escalera de Tuckman se encuentra el equipo y compárenla con la trayectoria que esperaba Ana. Justifiquen con dos evidencias del relato y propongan dos acciones de liderazgo.
- **RACIS:** identifiquen qué fila de la matriz RACIS del proyecto explica el problema con el Proveedor del SDK y redefinan su asignación. Agreguen una fila nueva para la integración de la billetera de la fintech.
- **Reuniones:** rediseñen la reunión de estatus aplicando los aspectos clave vistos en clase.
- **Interesados:** incorporen al registro el nuevo interesado del relato: evaluación, clasificación y estrategia.
- **Comunicaciones:** evalúen el pedido del sponsor frente al plan vigente y propongan la fila del plan que corresponda, fundamentando el método elegido.

Tiempo disponible: 40 minutos. ¡A trabajar!

Criterios de Evaluación del Taller

Rúbrica formativa para la puesta en común; reutilizable en los mini casos de estudio de la materia

Criterio	Logrado	En proceso	No logrado
Diagnóstico del equipo (Tuckman)	Etapa correcta, dos evidencias y dos acciones coherentes	Etapa correcta con justificación parcial	Etapa incorrecta o sin justificación
Aplicación de la RACIS	Detecta la causa, corrige respetando las reglas y agrega la fila nueva	Corrige pero viola alguna regla (A único, R presente)	No identifica la fila problemática
Diseño de reuniones	Aplica propósito, participantes, agenda, timebox, registro y seguimiento	Aplica algunos aspectos	Propuesta genérica
Registro de interesados	Evaluación y clasificación consistentes con la estrategia	Clasificación sin estrategia coherente	Omite al interesado o lo clasifica mal
Plan de comunicaciones	Método y frecuencia justificados según el perfil del interesado	Propuesta sin fundamentar el método	Acepta el pedido sin análisis

Verificación de Resultados: Equipo e Interesados

PMBOK 7, §2.2.7 y §2.1.3: cómo comprobar que los dominios de hoy funcionan

EQUIPO

- **Propiedad compartida:** todos conocen la visión y los objetivos, y se sienten dueños de los entregables.
- **Alto rendimiento:** el equipo confía, colabora, se adapta y decide sin microgestión.
- **Liderazgo de todos:** los miembros aplican pensamiento crítico y habilidades interpersonales.

INTERESADOS

- **Relación productiva:** se observa el involucramiento y se registran sus cambios.
- **Acuerdo con los objetivos:** pocos cambios o solicitudes que contradigan el alcance.
- **Satisfacción:** encuestas, entrevistas o grupos focales; el registro de incidentes muestra si los opositores afectan el proyecto.

Síntesis y Próxima Clase

- El Dominio del Equipo busca que un conjunto de personas evolucione hasta ser un equipo de alto rendimiento; la escalera de Tuckman ayuda a diagnosticar en qué etapa está y no es lineal.
- El organigrama muestra quién integra el proyecto; la matriz RACIS define quién ejecuta, rinde cuentas, opina, se informa y firma cada tarea; la estructura organizacional define cuánta autoridad real tiene el director.
- Las reuniones son el medio de comunicación primario: sin propósito, agenda, timebox y minuta, consumen el tiempo del camino crítico.
- El registro de interesados dice a quién atender y con qué prioridad; el plan de gestión de las comunicaciones dice qué, cómo, cuándo y quién; las barreras, los informes y tableros y el cierre administrativo completan la gestión de las comunicaciones.
- **Próxima clase:** Taller de Recursos del Proyecto, Juicio de Experto y Matriz RACI (Cronograma, Clase 10): construcción de la OBS y la RACI del proyecto de cada grupo. Entrega TP N°2: sábado 03/10.

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK®, 7.ª edición. Sección 2.1 "Dominio de Desempeño de los Interesados", Sección 2.2 "Dominio de Desempeño del Equipo", §3.3.3 (involucramiento), §4.2.2 (modelos de comunicación), §4.2.6 (modelos de desarrollo del equipo), §4.4.3 (reuniones y eventos) y §4.6 (artefactos).
- Project Management Institute (2021). El Estándar para la Dirección de Proyectos (incluido en la Guía del PMBOK®, 7.ª ed.), Sección 3: principios "Crear un entorno colaborativo del equipo" y "Demostrar comportamientos de liderazgo".
- Project Management Institute (2017). Guía del PMBOK®, 6.ª edición (referencia complementaria: registro de interesados, plan de gestión de las comunicaciones e influencias organizacionales).
- Palombo, O. Dominio de Desempeño del Equipo. Material de la cátedra UADE - FACO. Rodriguez, G. (2013). Filminas Gerenciamiento de los Recursos.
- Material de la cátedra UADE - FAIN: Clases 01 y 03 a 08 (estructuras organizacionales y caso Home Banking Digital). Lectura complementaria: Clase 09 (Comunicaciones e Interesados) y Clase 10 (Recursos Humanos).
