Gerenciamiento de Proyectos

Gestión de Valor, Principios y Dominios

Lic. Ornela Palombo

Hace clic en la imagen para acceder al video



Gestion de Proyectos Segun Pelicula Bichos

GDP SEGÚN LA PELÍCULA BICHOS | PUESTA EN COMÚN

1. **Definir el Problema:** una de las hormigas tiró toda la comida y ahora no se le puede “pagar” el tributo a los saltamontes

2. **Búsqueda de la solución:** se plantean dos opciones, una primera orientada a que la hormiga que causo el problema busque otros bichos que peleen contra los saltamontes para que se ocupe de otro tema y el resto pudiera lograr conseguir comida de vuelta. Luego surge otra opción que es desarrollar un pájaro gigante que ahuyente a los saltamontes.

3. **Planificación:** involucra múltiples aspectos.

- Propósito ¿para qué hago el proyecto?: derrotar al saltamonte, darle miedo, lograr que se vaya.
- Objetivo de Proyecto: Construir un pájaro lo suficiente grande y temeroso para que asuste al líder de los saltamontes y logre que este se vaya.

- Cliente: las hormigas representan a la organización que solicita el proyecto
- Organización ejecutora : el circo representa a la organización que impulsa la ejecución del proyecto.

- ¿Sponsor o PM?: Princesa: motiva, dirige, lidera. Todos la escuchan por sus rasgos, personalidad y su capacidad de persuasión. Al defender la idea del proyecto y al impulsarlo, cumple más un rol de Sponsor que brinda apoyo político y facilita los recursos.
- PM: Flickr podría estar cumpliendo dicho rol de Director de Proyecto, guiando al equipo, dando pautas de cómo sería el pájaro, buscando soluciones.

- Equipo de Proyecto: había muchos personajes y cada uno estaba dividido en distintos en sectores y respondían a la líder. Ej. marcar lo que era figura del pájaro, llevaban materiales para armar el pájaro, araña tejiendo para juntar las partes, las luciérnagas iluminando a la noche. Esto lo que marca es la importancia de potenciar las habilidades de cada integrante del equipo para lograr el resultado.

- Plazo determinado: inicia cuando aparece la solución al problema. Debía finalizar para cuando llegaran los saltamontes que venían a reclamar la cosecha.

GDP SEGÚN LA PELÍCULA BICHOS | PUESTA EN COMÚN

1. **Definir el Problema**
2. **Búsqueda de la solución**
3. **Planificación**

4. **Ejecución del Proyecto**: se lleva a cabo la planificación del proyecto. El equipo tiene que estar bien organizado, tiene que estar coordinado, cada uno debe cumplir su rol, es decir su papel y sus responsabilidades para lograr el objetivo del proyecto.

   Riesgos de un proyecto: que cuando ejecuto es cuando pueden empezar a aparecer. Por ejemplo la roca que traba y no deja que el mecanismo de vuelo del pájaro funcione. Lo terminan resolviendo “de forma manual” y finalmente logran que el pájaro pueda volar.

5. **Monitoreo y Control:** verifico que todo este saliendo acorde al plan y si no es así busco soluciones y ajusto sobre la marcha.

6. **Cierre:** evalúo los resultados de la aplicación de este proyecto y verifico la generación de valor. El equipo de proyecto se disuelve.

Evolución del Gerenciamiento de Proyectos

	1950 a 1990 Enfoque convencional	1990 a 2021 Enfoque moderno	2021 a hoy Enfoque actual
Mayor énfasis en:	aspectos técnicos	aspectos de negocio	Valor, principios, personas, adaptabilidad
El éxito se mide por:	cumplir con los objetivos técnicos	cumplir con el plazo, costo, alcance calidad y aceptación del cliente	Entrega de valor, satisfacción de stakeholders.
Principales habilidades del GP:	habilidades técnicas	conocimiento del negocio manejo del riesgo habilidades de integración	Liderazgo, agilidad, visión estratégica, comunicación
Motivos de fracaso:	Problemas en: Planificación Estimación Programación Control	Problemas: De comunicación Baja moral Falta de compromiso Relaciones conflictivas	Problemas relacionados con: Falta de valor, mala gestión de interesados, rigidez, aislamiento

Enfoque actual del GDP >> ENTREGAR VALOR

- La **entrega de valor** es un concepto fundamental que se refiere a la cualidad, importancia o utilidad de algo, siendo el **indicador definitivo del éxito del proyecto**.

- Los proyectos producen **salidas (entregables) que impulsan resultados (outcomes)** que, en última instancia, aportan valor a la organización y a sus interesados.

- El valor puede obtenerse a lo largo del proyecto, al final de este, o incluso después de su culminación, y puede definirse en términos cuantitativos y/o cualitativos

Enfoque actual del GDP >> ENTREGAR VALOR

- Los proyectos operan dentro de un sistema más amplio de la organización para la entrega de valor, el cual es un conjunto de actividades estratégicas de negocio dirigidas a la construcción, sostenimiento y/o avance de una organización.

- Portafolios, programas, proyectos, productos y operaciones pueden formar parte de este sistema y se utilizan individual y colectivamente para crear valor.

- Este sistema funciona con mayor eficacia cuando la información y la retroalimentación se comparten de manera consistente entre todos los componentes, manteniendo el sistema alineado con la estrategia y en sintonía con el entorno.

Creación de Valor a través de Proyectos

- Los proyectos son el vehículo que las organizaciones utilizan para obtener un resultado o producto único que genera valor.


- Algunos ejemplos de cómo los proyectos producen valor incluyen la creación de nuevos productos o servicios que satisfacen las necesidades del cliente, la realización de contribuciones sociales o ambientales positivas, la mejora de la eficiencia o la productividad, la habilitación de los cambios organizacionales deseados, y la conservación de beneficios de iniciativas anteriores.

- La intención de cada proyecto es proporcionar un resultado deseado que aborde una necesidad con una solución valorada.

Principios rectores del GDP

- Un principio es una norma, verdad o **valor fundamental**.
- El PMI establece **12 principios** clave para entregar efectivamente los resultados de un proyecto.
- Estos principios:
  - **guían el comportamiento** de las personas involucradas en los proyectos.
  - proporcionan **parámetros** dentro de los cuales los equipos del proyecto pueden operar.
  - brindan **orientación a las actividades** en cada uno de los dominios de desempeño.
- A partir de ellos, se desarrollan artefactos, modelos y métodos que permitirán gestionar cada aspecto de un proyecto.

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

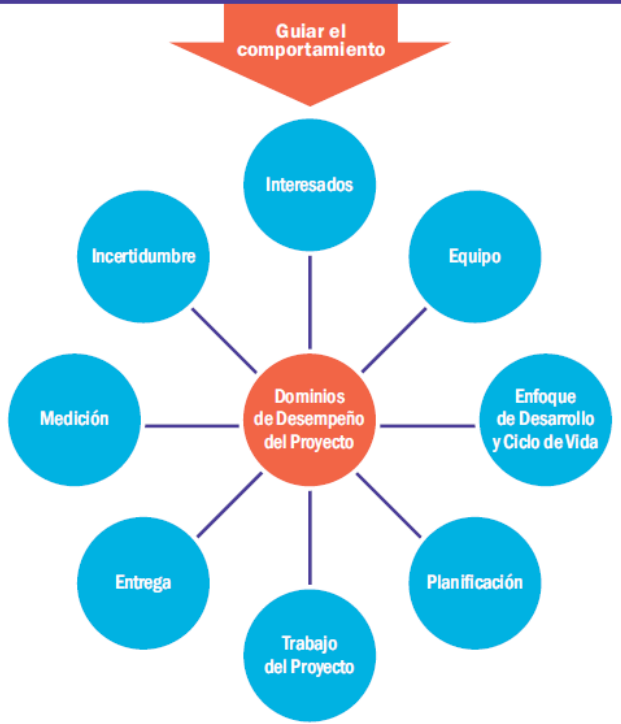

Valores clave vinculados con los Principios

A partir de estos valores se propone la ética del Gerenciamiento de Proyectos

- → **Responsabilidad**: ser dueño de acciones y decisiones
- → **Respeto:** trato y manejo correcto de personas y recursos
- → **Imparcialidad**: ser objetivo
- → **Honestidad**: entender la verdad y tomar decisiones con base a ella

Los principios y valores están para guiarnos en la adaptación de artefactos y herramientas según las necesidades de cada proyecto.

Los 12 Principios del GDP

Principios de la Dirección de Proyectos			
1 Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	2 Crear un entorno colaborativo del equipo	3 Involucrarse eficazmente con los interesados	4 Enfocarse en el valor
5 Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	6 Demostrar conductas de liderazgo	7 Adaptar con base en el contexto	8 Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
9 Navegar en la complejidad	10 Optimizar las respuestas a los riesgos	11 Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	12 Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

1. “Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso”

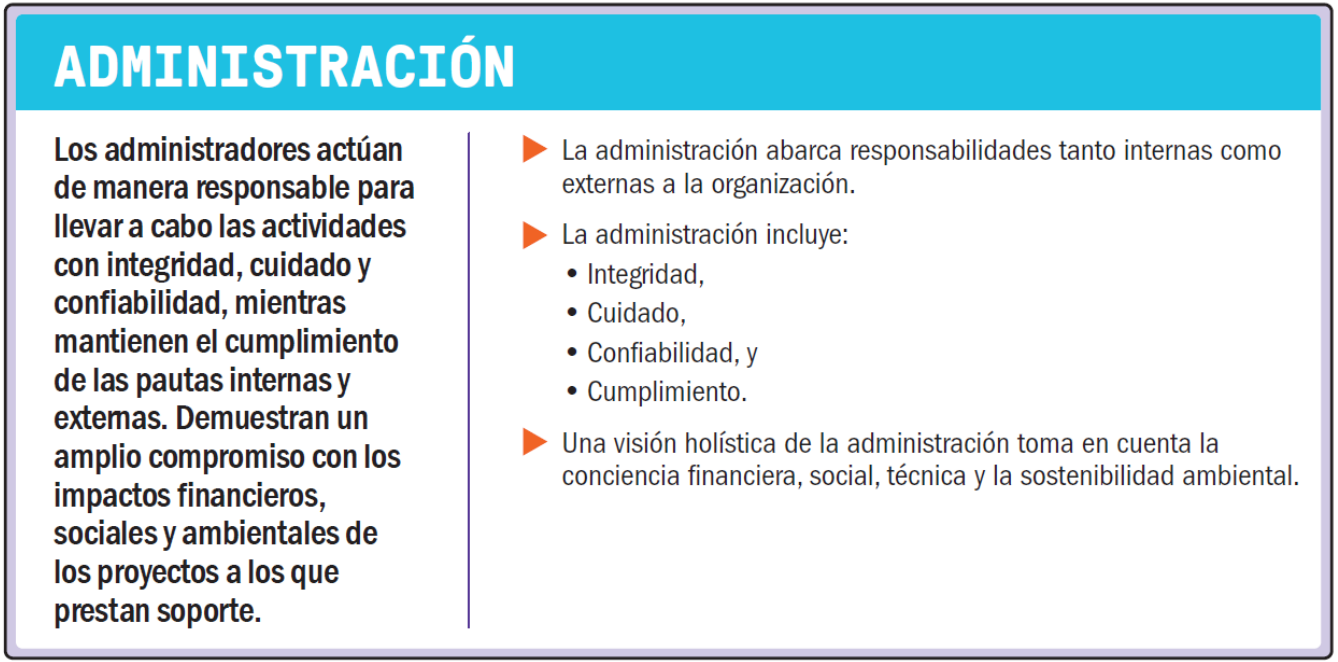


Gráfico 3-2. Ser un Administrador Diligente, Respetuoso y Cuidadoso

2. “Crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto”

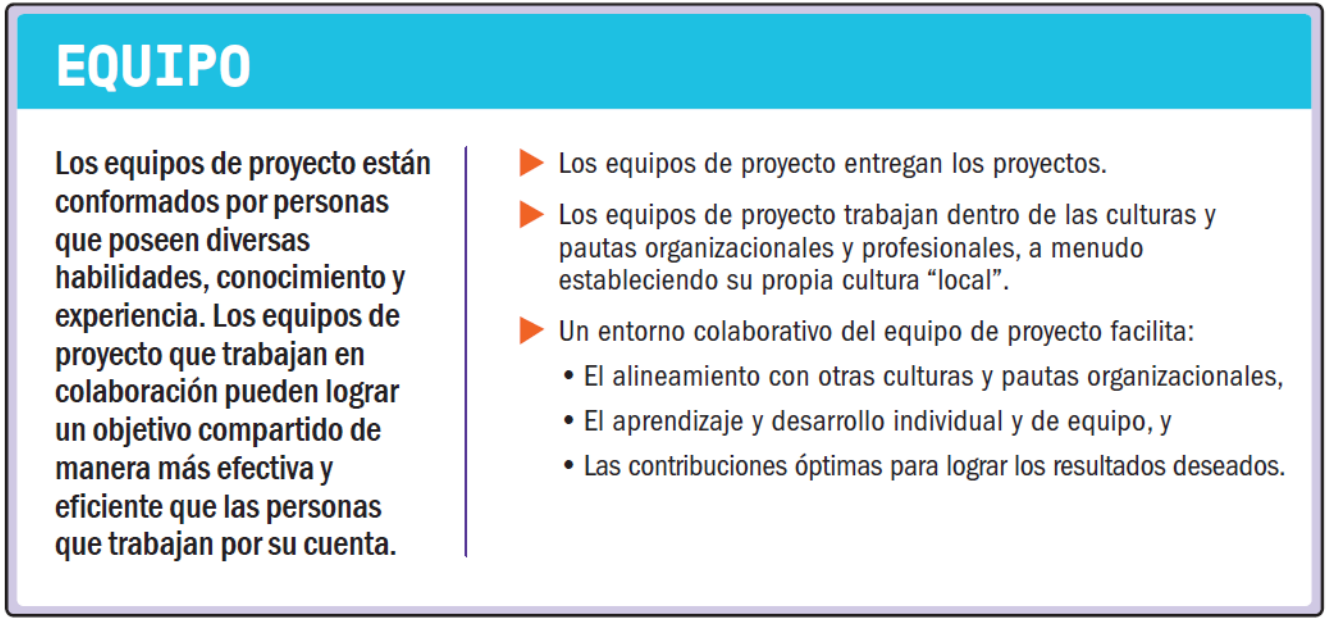


Gráfico 3-3. Crear un Entorno Colaborativo del Equipo del Proyecto

3. “Involucrarse eficazmente con los interesados”

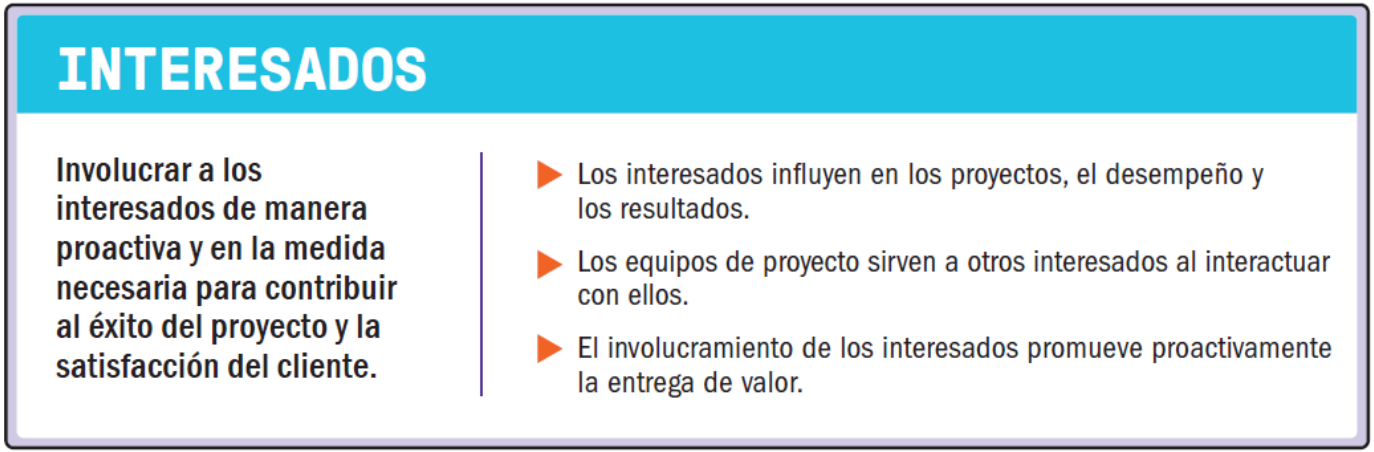


Gráfico 3-4. Involucrarse Eficazmente con los Interesados

4. “Enfocarse en el Valor”

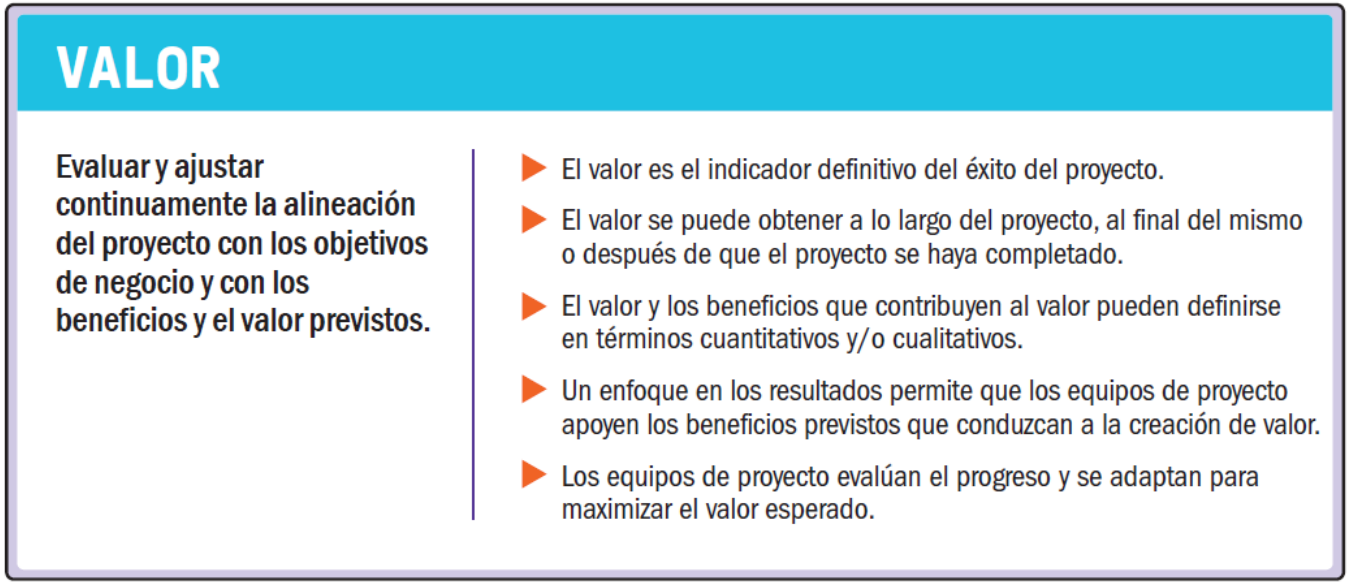


Gráfico 3-5. Enfocarse en el Valor

5. “Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema”

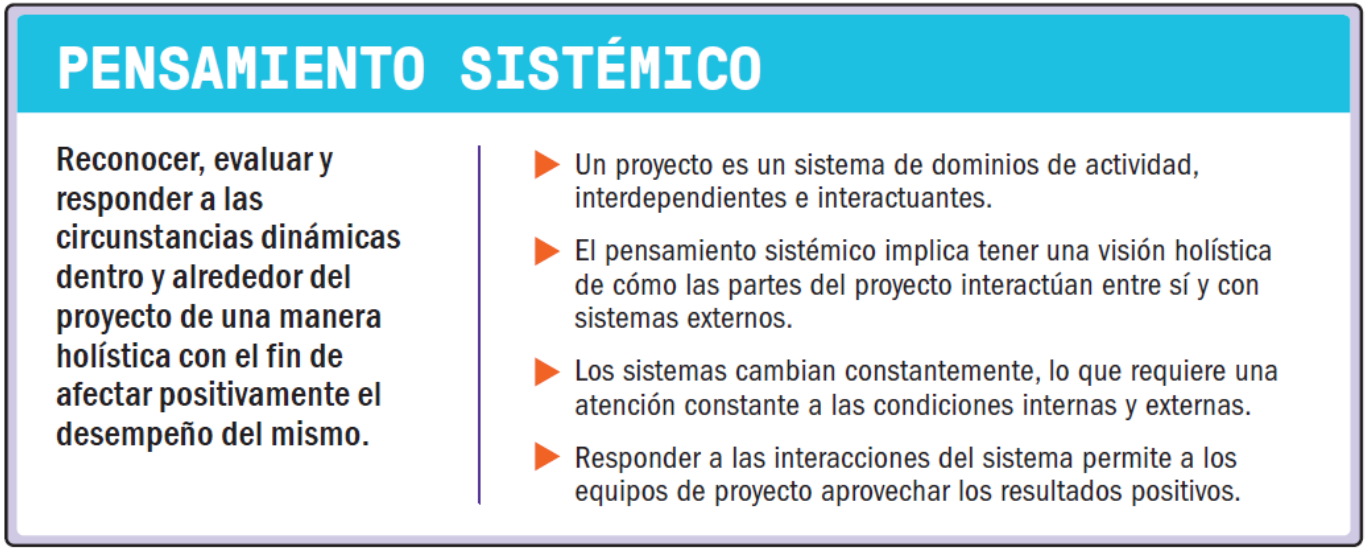


Gráfico 3-6. Reconocer, Evaluar y Responder a las Interacciones del Sistema

6. “Demostrar comportamientos de Liderazgo”

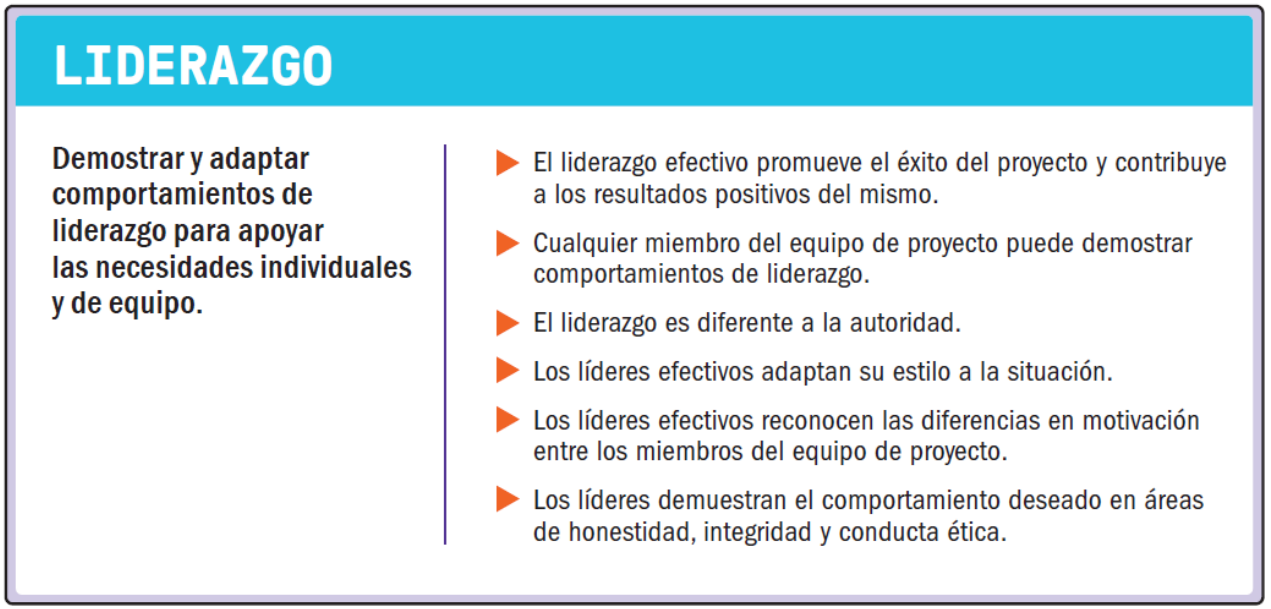


Gráfico 3-7. Demostrar Comportamientos de Liderazgo

7. “Adaptación en función del contexto”

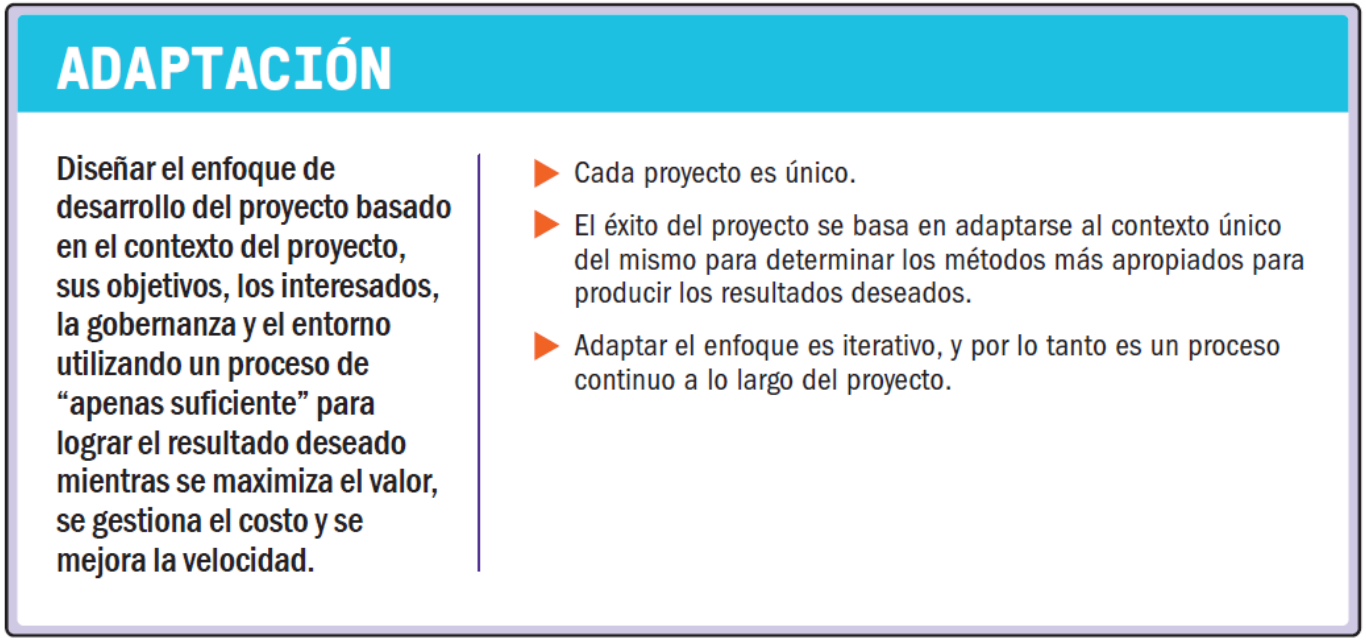


Gráfico 3-8. Adaptar en Función del Contexto

8. “Incorporar la calidad en los procesos y los entregables”

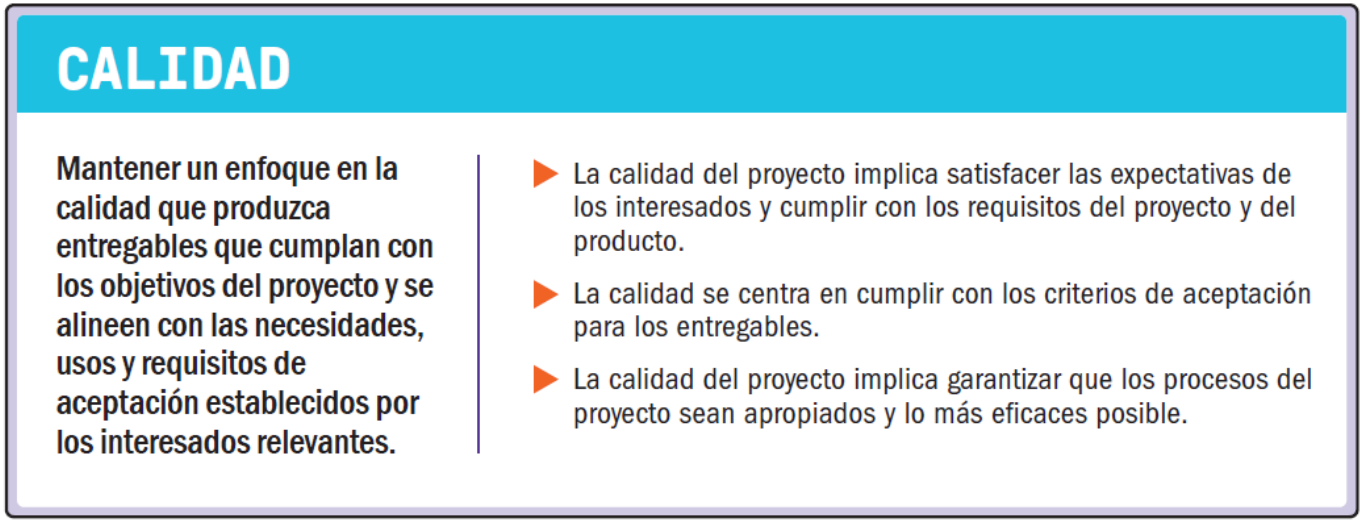


Gráfico 3-9. Incorporar la Calidad en los Procesos y los Entregables

9. “Navegar la complejidad”

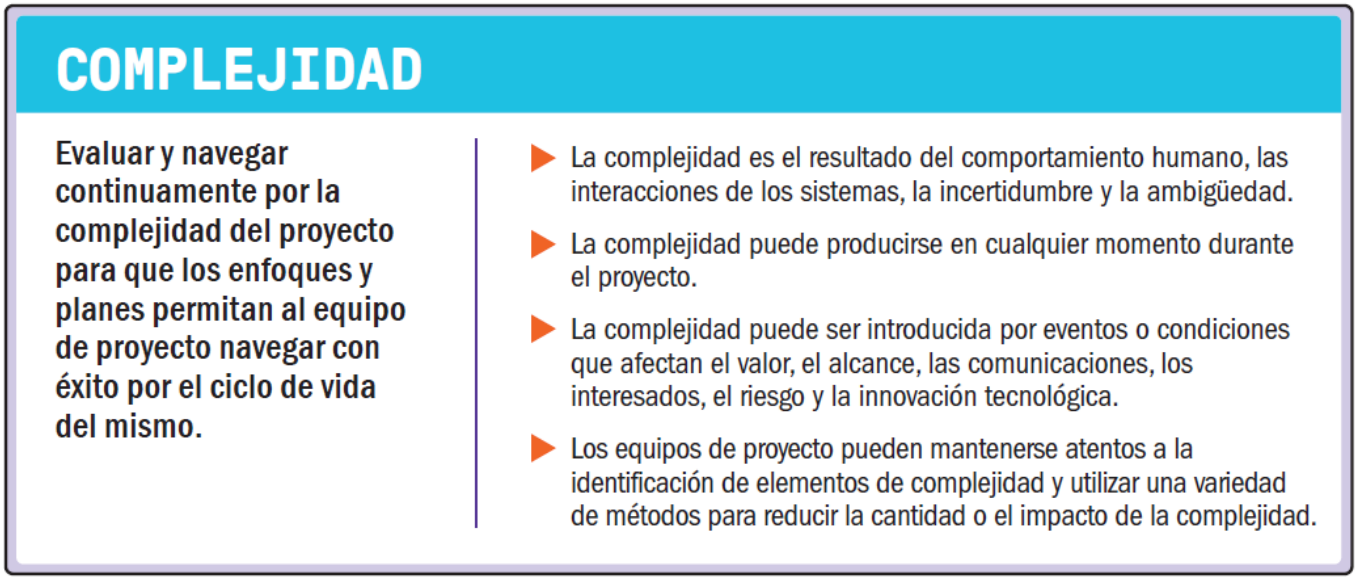


Gráfico 3-10. Navegar en la Complejidad

10. “Optimizar las respuestas a los riesgos”

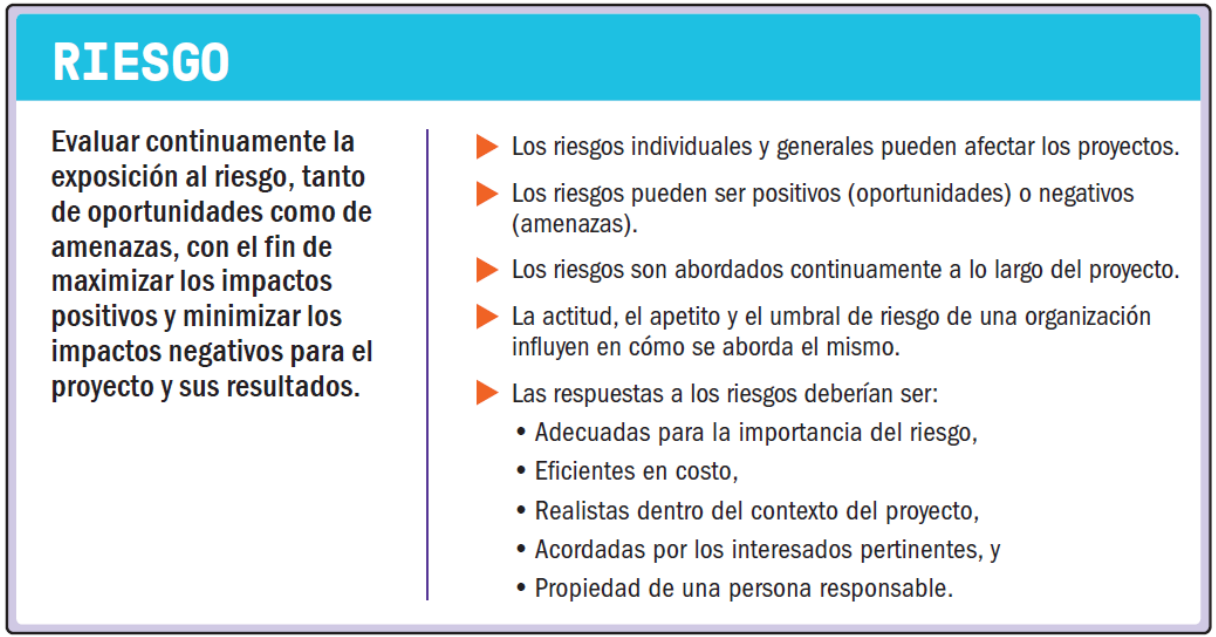


Gráfico 3-11. Optimizar las Respuestas a los Riesgos

11. “Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia”

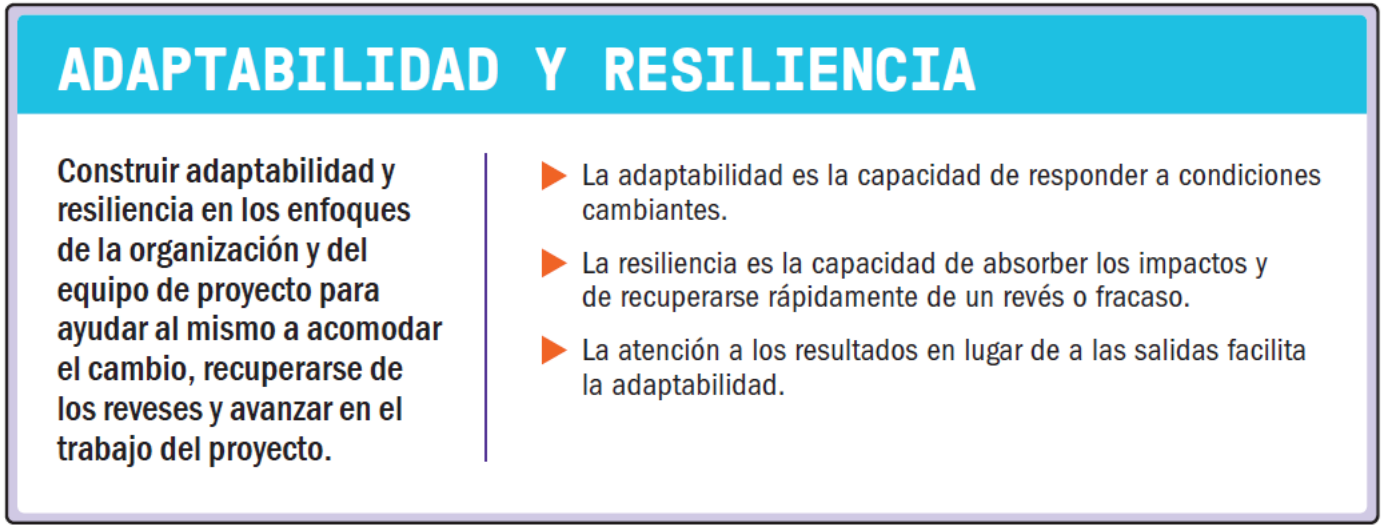


Gráfico 3-12. Adoptar la Adaptabilidad y la Resiliencia

12. “Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto”

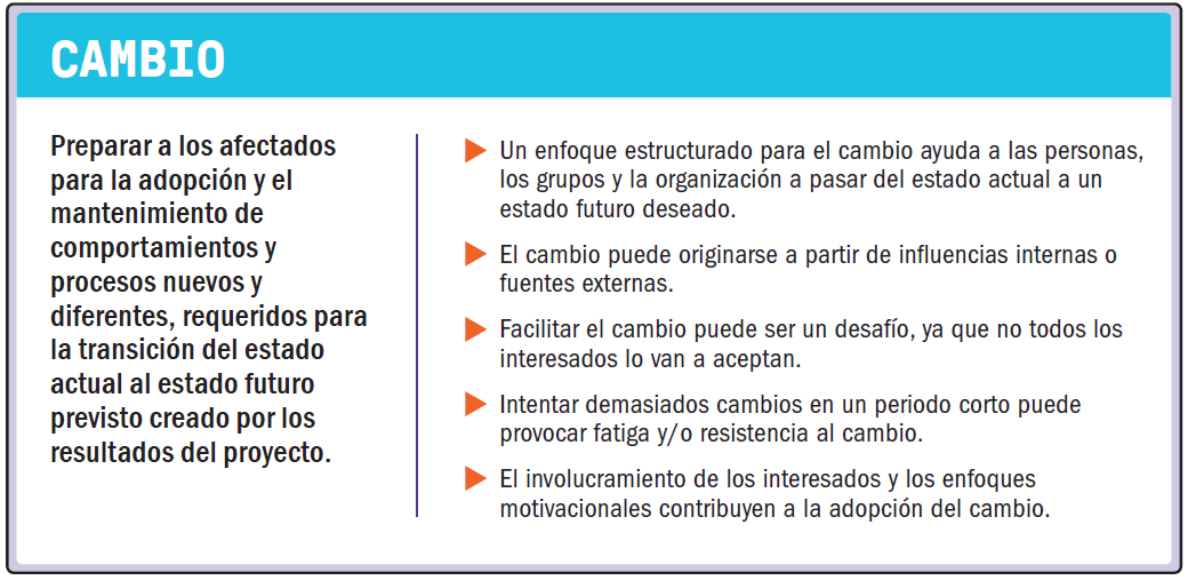


Gráfico 3-13. Permitir el Cambio para Lograr el Estado Futuro Previsto

Dominios de Desempeño en el GDP

- Un dominio representa un **grupo de actividades relacionadas** que son esenciales para la consecución efectiva de los resultados de los proyectos.
- El PMI propone **8 dominios de desempeño** que pueden adaptarse según el proyecto. Es decir, adecuarse conforme al enfoque, la gobernanza y los procesos de la DP que resulten más apropiados para el entorno y el trabajo en cuestión.
- El **proceso de adaptación se rige por los principios rectores** de la dirección de proyectos, los **valores y** la **cultura** organizacional.
- Son áreas clave **interactivas, interrelacionadas e interdependientes** que funcionan al unísono para conseguir los resultados deseados del proyecto.
- Por tanto, funcionan como un sistema integrado.

Los 8 Dominios de Desempeño del GDP



1. Interesados

DOMINIO DE DESEMPEÑO DE LOS INTERESADOS

El Dominio de Desempeño de los Interesados se ocupa de las actividades y funciones asociadas con los interesados

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Una relación de trabajo productiva con los interesados a lo largo del proyecto.
- Acuerdo de los interesados con los objetivos del proyecto.
- Los interesados que son beneficiarios del proyecto brindan apoyo y están satisfechos; los interesados que pueden oponerse al proyecto o a sus entregables no afectan negativamente los resultados del proyecto.

Las siguientes definiciones son relevantes para el Dominio de Desempeño de los Interesados:

Interesado. Individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio.

Análisis de Interesados. Método que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar los intereses de quiénes deberían tenerse en cuenta a lo largo del proyecto.

2. Equipo

DOMINIO DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO

El Dominio de Desempeño del Equipo se ocupa de las actividades y funciones asociadas con las personas responsables de producir los entregables del proyecto que hacen realidad los resultados de negocio.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Propiedad compartida.
- Un equipo de alto rendimiento.
- Todos los miembros del equipo demuestran liderazgo aplicable y otras habilidades interpersonales.

Las siguientes definiciones son pertinentes para el Dominio de Desempeño del Equipo:

Director del Proyecto. Persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo de proyecto que es responsable de alcanzar los objetivos del mismo.

Equipo de Dirección de Proyecto. Miembros del equipo de proyecto que participan directamente en las actividades de dirección del proyecto.

Equipo de Proyecto. Conjunto de individuos que realizan el trabajo del proyecto con el fin de alcanzar sus objetivos.

3. Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida

DOMINIO DEL ENFOQUE DE DESARROLLO Y DEL DESEMPEÑO DEL CICLO DE VIDA

El Dominio del Enfoque de Desarrollo y del Desempeño del Ciclo de Vida aborda las actividades y funciones asociadas con el enfoque de desarrollo, la cadencia y las fases del ciclo de vida del proyecto.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Enfoques de desarrollo que son consistentes con los entregables del proyecto.
- Un ciclo de vida del proyecto que consiste en fases que conectan la entrega del valor del negocio y el valor para los interesados desde el comienzo hasta el final del proyecto.
- Un ciclo de vida del proyecto que consta de fases que facilitan la cadencia de entrega y el enfoque de desarrollo necesarios para elaborar los entregables del proyecto.

3. Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida

Las siguientes definiciones son pertinentes para el Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida:

Entregable. Cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto.


Enfoque de Desarrollo. Método utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto, tal como un método predictivo, iterativo, incremental, adaptativo o híbrido.

Cadencia. Ritmo de las actividades realizadas a lo largo del proyecto.

Fase del Proyecto. Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables.

Ciclo de Vida del Proyecto. Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión.

El ciclo de vida de un proyecto

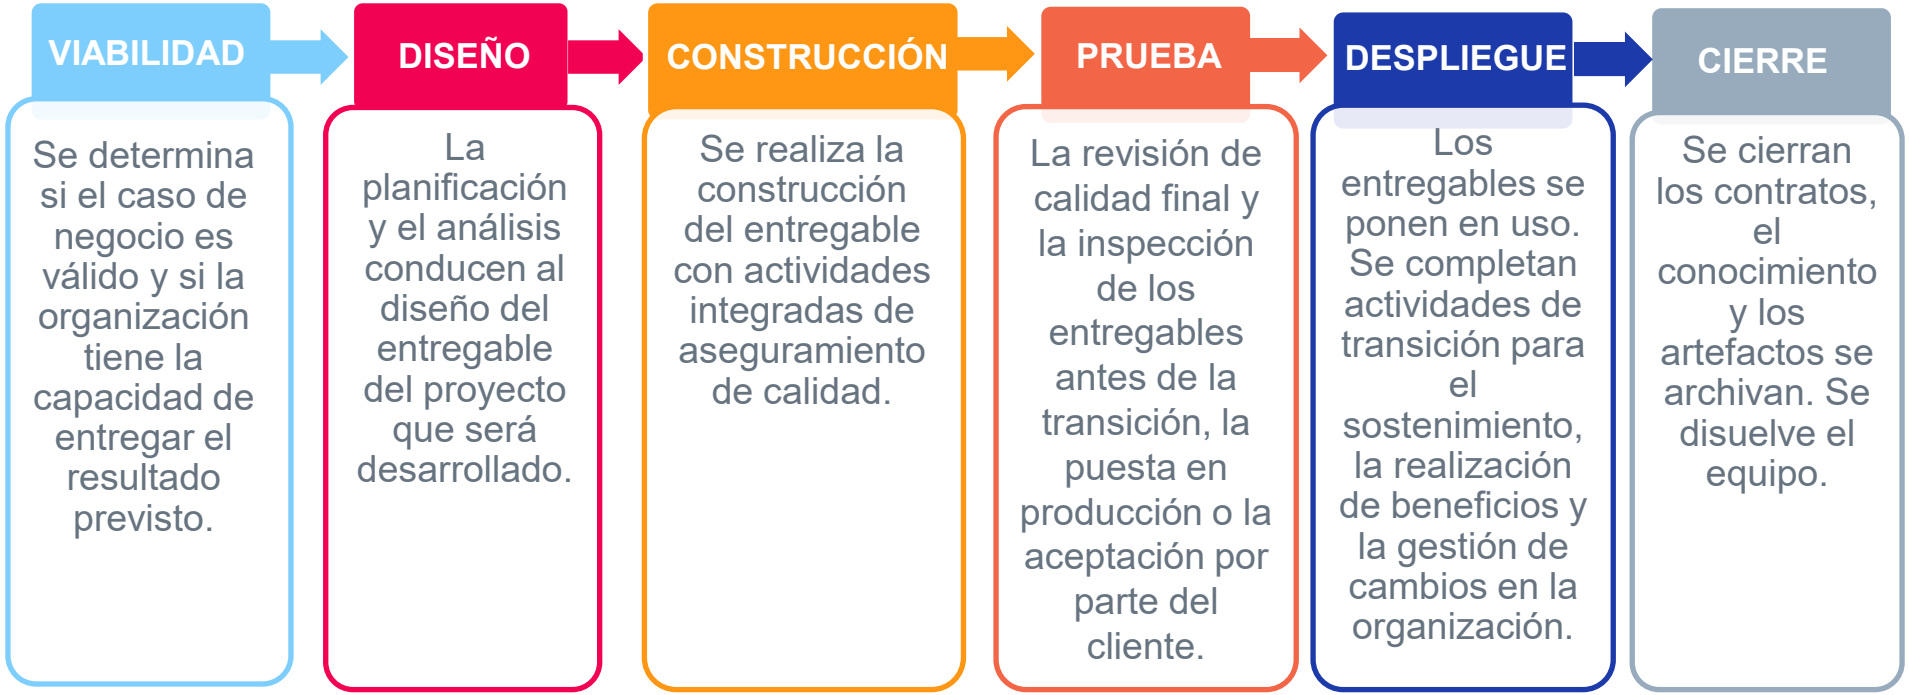

Enfoque de desarrollo

Es el medio utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto. Tres de los enfoques comúnmente utilizados son predictivo, híbrido y adaptativo.







Fuente imágenes: https://pmcollege.edu.ni/i-dominios-en-la-septima-edicion-guia-pmbok-desempeno-del-enfoque-de-desarrollo-y-del-ciclo-de-vida/

Enfoque de Desarrollo Predictivo

- Un enfoque predictivo, también conocido como cascada, es útil cuando los requisitos del proyecto y del producto pueden definirse, recopilarse y analizarse al comienzo del proyecto.

- También se puede utilizar cuando existe una inversión significativa involucrada y un alto nivel de riesgo que puede requerir revisiones frecuentes, mecanismos de control de cambios y replanteo entre las fases de desarrollo.

- El alcance, cronograma, costo, necesidades de recursos y riesgos pueden quedar bien definidos en las fases tempranas del ciclo de vida del proyecto, y son relativamente estables.

- Este enfoque de desarrollo permite al equipo del proyecto reducir el nivel de incertidumbre en una etapa temprana en el proyecto y efectuar gran parte de la planificación por adelantado.

Enfoque de Desarrollo Híbrido

- Un enfoque de desarrollo híbrido es una combinación de enfoques adaptativos y predictivos.

- Este enfoque de desarrollo es útil cuando:
  - hay incertidumbre o riesgo en torno a los requisitos
  - los entregables pueden ser modularizados
  - hay entregables que pueden ser desarrollados por diferentes equipos de proyecto.

- Un enfoque híbrido es más adaptativo que un enfoque predictivo, pero menos que un enfoque puramente adaptativo.

- A menudo utilizan un enfoque de desarrollo iterativo o incremental. Este es útil para aclarar los requisitos e investigar diversas opciones.

- Se utiliza un enfoque incremental para producir un entregable a lo largo de una serie de iteraciones.
- Cada iteración añade funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado (período de tiempo preestablecido).
- El entregable puede considerarse como completado sólo después de la iteración final.

Enfoque de Desarrollo Adaptativo

- Los enfoques adaptativos son útiles cuando los requisitos están sujetos a un alto nivel de incertidumbre y volatilidad y es probable que cambien a lo largo del proyecto.

- Se establece una visión clara al comienzo del proyecto y los requisitos iniciales son refinados, detallados, cambiados o reemplazados de acuerdo con los comentarios del usuario, el entorno o eventos inesperados.

- Los enfoques adaptativos utilizan enfoques iterativos e incrementales.
- Sin embargo, en el extremo opuesto de los métodos adaptativos, las iteraciones tienden a ser más cortas y es más probable que el producto evolucione en función de la retroalimentación de los interesados.

- El equipo de proyecto está muy comprometido con la planificación de cada iteración. Este determinará el alcance que puede lograr en función de una lista de trabajo pendiente priorizado, estimará el trabajo involucrado y trabajará en colaboración a lo largo de la iteración con el propósito de desarrollar el alcance.

4. Planificación

DOMINIO DE DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN

El Dominio de Desempeño de la Planificación aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución, necesarias para la entrega de los elementos entregables y los resultados del proyecto.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- El proyecto avanza de manera organizada, coordinada y deliberada.
- Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto.
- Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto.
- Se elabora información evolutiva para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto.
- El tiempo dedicado a la planificación es adecuado para la situación.
- La información de planificación es suficiente para gestionar las expectativas de los interesados.

Dentro del dominio de desempeño de la Planificación profundizaremos en cuatro aspectos clave de la gestión de un proyecto:

- Alcance
- Plazos
- Costos
- Adquisiciones

5. Trabajo del Proyecto

DOMINIO DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO DEL PROYECTO

El Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto aborda las actividades y funciones asociadas con el establecimiento de los procesos del proyecto, la gestión de los recursos físicos y el fomento de un entorno de aprendizaje.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Desempeño eficiente y efectivo del proyecto.
- Los procesos del proyecto son apropiados para el proyecto y el entorno.
- Comunicación adecuada con los interesados.
- Gestión eficiente de los recursos físicos.
- Gestión eficaz de las adquisiciones.
- Capacidad mejorada del equipo gracias al aprendizaje continuo y la mejora de los procesos.

6. Entrega

DOMINIO DE DESEMPEÑO DE LA ENTREGA

El Dominio de Desempeño de la Entrega aborda las actividades y funciones asociadas con la entrega del alcance y la calidad para cuyo logro se emprendió el proyecto.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Los proyectos contribuyen a los objetivos de negocio y al avance de la estrategia.
- Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados.
- Los beneficios del proyecto se obtienen en el plazo en que se planificaron.
- El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos.
- Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto.

Dentro del dominio del desempeño de la Entrega profundizaremos en un aspecto clave de la gestión de un proyecto:

- Calidad

7. Medición

DOMINIO DE DESEMPEÑO DE LA MEDICIÓN

El Dominio de Desempeño de la Medición aborda las actividades y funciones asociadas con la evaluación del desempeño de los proyectos y la adopción de medidas apropiadas para mantener un desempeño aceptable.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Una comprensión confiable del estado del proyecto.
- Datos procesables para facilitar la toma de decisiones.
- Acciones oportunas y apropiadas para mantener el desempeño del proyecto de acuerdo a lo planeado.
- Lograr objetivos y generar valor de negocio mediante la toma de decisiones informadas y oportunas basadas en pronósticos y evaluaciones confiables.

Dentro del dominio del desempeño de la Medición profundizaremos en un método clave para medir la gestión de un proyecto: el método de valor ganado

8. Incertidumbre


DOMINIO DE DESEMPEÑO DE LA INCERTIDUMBRE

El Dominio de Desempeño de la Incertidumbre se ocupa de las actividades y funciones asociadas con el riesgo y la incertidumbre.

La ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados:

- Concientización del entorno en el que se producen los proyectos, incluidos, entre otros, los entornos técnico, social, político, de mercado y económico.
- Exploración proactiva y respuesta a la incertidumbre.
- Concientización de la interdependencia de múltiples variables en el proyecto.
- La capacidad de anticipar amenazas y oportunidades y comprender las consecuencias de los incidentes.
- Entrega de proyectos con poco o ningún impacto negativo procedente de eventos o condiciones imprevistas.
- Se aprovechan las oportunidades para mejorar el desempeño y los resultados del proyecto
- Las reservas de costos y cronograma se utilizan de manera efectiva para mantener la alineación con los objetivos del proyecto.

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

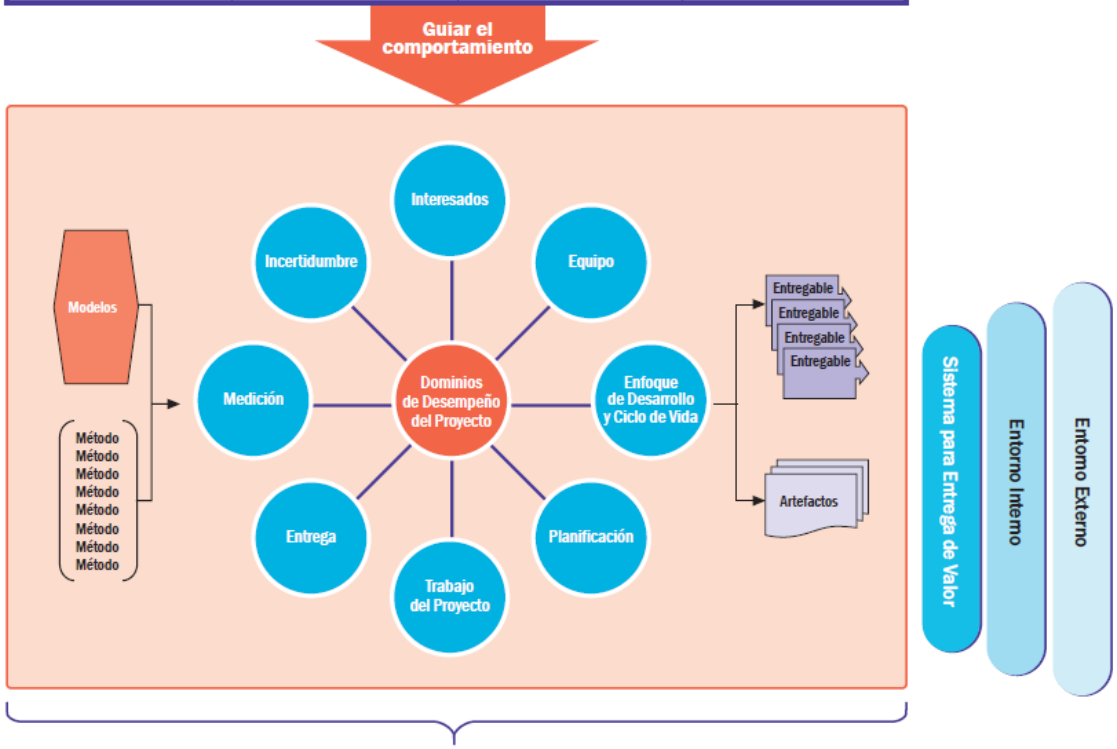

Modelos | Métodos | Artefactos

Modelo: es una estrategia de pensamiento para explicar un proceso, marco de referencia o fenómeno.

Método: un método es el medio para lograr un efecto, salida, resultado o entregable del proyecto.

Artefacto: un artefacto puede ser una plantilla, documento, salida o entregable del proyecto.

Modelos

- Es una estrategia de pensamiento para explicar un proceso, marco de referencia o fenómeno.
- Los modelos reflejan vistas simplificadas y en pequeña escala de la realidad.
- Presentan escenarios, estrategias o enfoques para optimizar los procesos y los esfuerzos de trabajo.
- Un modelo ayuda a explicar cómo funciona algo en el mundo real.
- Por ejemplo, en el dominio de desempeño del equipo podemos aplicar el Modelo del Liderazgo Situacional.

Métodos

- Un método es un medio para lograr un efecto, salida, resultado o entregable del proyecto.
- Existen una diversidad de métodos para apoyar el trabajo en los proyectos.
- Muchos de los métodos están relacionados por el propósito al que sirven, como la estimación o la recopilación de datos.
- Otros están relacionados por el tipo de actividad que se realiza, como en los grupos de reuniones y los grupos de análisis.
- Por ejemplo, por el alcance de esta materia veremos métodos como el del Camino Crítico o el Método del Valor Ganado.

Artefactos

- Un artefacto es una plantilla, documento, salida o entregable del proyecto.
- En el PMBOK 7 las descripciones que se presentan de los artefactos son a un alto nivel, ya que se espera que los PM adapten su uso según las necesidades concretas de su proyecto.
- Para conocer más sobre el desarrollo de los artefactos se puede consultar el PMBOK 6. Allí aparecerán como: salidas, entregables o herramientas.
- En el transcurso del dictado de la materia, veremos cómo desarrollar múltiples artefactos como el Acta de Constitución del Proyecto o el WBS.

UNA HERRAMIENTA DE IA A FAVOR DEL APRENDIZAJE CONSCIENTE

- Busca la séptima edición del PMBOK
- Ingresa a https://notebooklm.google.com/
- Crea tu primer cuaderno cargando el PDF del PMBOK
- Comenzá a explorar los contenidos y a profundizar los ya vistos a través de preguntas clave, por ejemplo:
  - ¿Qué criterios se deben considerar para seleccionar el enfoque de desarrollo de un proyecto?
  - ¿Cómo interactúan los dominios?
  - ¿De qué manera se puede aplicar el principio de valor?
- Probá todas las opciones que brinda la herramienta para crear documentos de repaso y estudio.

Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash

- Bibliografía: Séptima edición del PMBOK (PMI).

Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2021).

Próxima Clase PRESENCIAL
Lunes 28/7 | 7:30hs | en PINAMAR:

Dominio del Desempeño de la Planificación

>> El Alcance del Proyecto

Artefactos clave: Project Charter, Scope Statement y WBS

>> **Inicio del TPO**
