
Dominio de Desempeño de la Planificación

ALCANCE DEL PROYECTO

Lic. Ornela Palombo

1

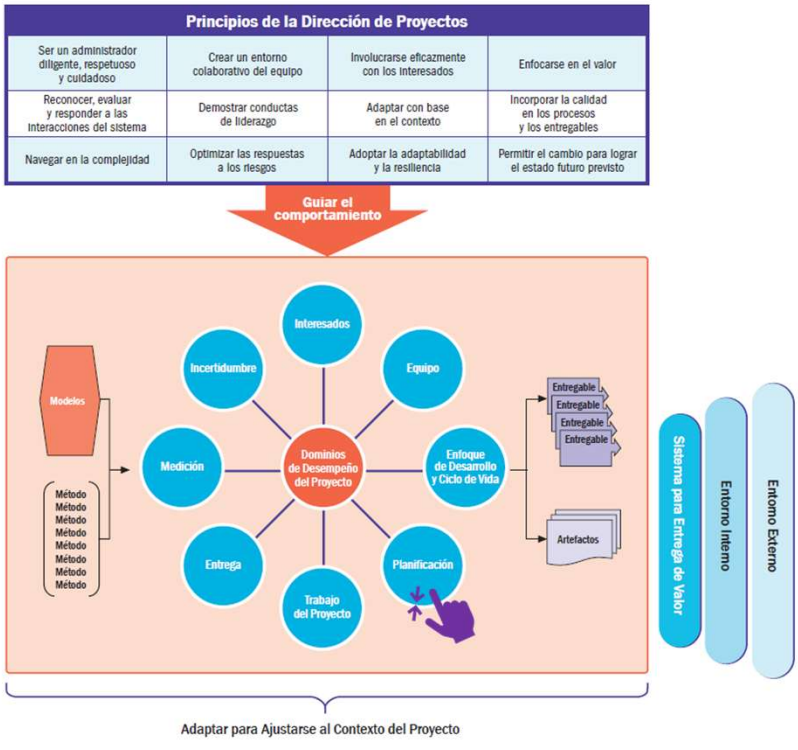

2

2

Dominio de Desempeño de la Planificación

- Se centra en **organizar, elaborar y coordinar el trabajo** del proyecto a lo largo de su totalidad.
- La meta principal de la planificación es desarrollar proactivamente **una dirección para crear los entregables** del proyecto, los cuales, a su vez, impulsarán los resultados esperados, generando valor para la organización.
- La forma de planificar **varía de acuerdo con el enfoque de desarrollo.**
- Sin embargo, siempre incluirá aspectos vinculados al alcance, costos, plazos, calidad, interesados, adquisiciones, equipo, métricas y verificación de resultados.

3

3

Dominio de Desempeño de la Planificación

- **Razones para planificar**:
  - ✓ Eliminar o reducir incertidumbre.
  - ✓ Mejorar la eficiencia de la operación.
  - ✓ Obtener mejor entendimiento de los objetivos.
  - ✓ Proveer base para monitoreo y control de los trabajos.
- **Se usa para:**
  - ✓ Guiar la ejecución del proyecto
  - ✓ Documentar las hipótesis de trabajo de la planificación del proyecto
  - ✓ Documentar las decisiones de planificación
  - ✓ Facilitar la comunicación entre stakeholders (interesados)
  - ✓ Proveer las líneas de base para el control del proyecto

4

4

¿Qué podemos planificar al Gerenciar un Proyecto?

- Una parte integral del dominio de la planificación es la definición del **ALCANCE**
- Esto implica definir y coordinar el trabajo necesario para lograr los resultados previstos del proyecto.
- El alcance, junto con los requisitos y las expectativas de calidad, es fundamental para producir los entregables esperados que impulsarán los resultados del proyecto.

5

5

Artefactos clave de la Planificación del Alcance

- Dentro de la Planificación del Alcance, son clave los siguientes documentos:
  - ✓ Acta Constitutiva del Proyecto (Project Charter)
  - ✓ Declaración del Alcance (Scope Statement)
  - ✓ Estructura de Descomposición del Trabajo (Work Breakdown Structures o WBS)

6

6

El Acta Constitutiva del proyecto (Project Charter)

- **Documento que autoriza formalmente** la existencia de un proyecto.
- **Confiere** al director de proyecto la **autoridad para asignar los recursos** de la organización a las actividades del proyecto.
- **Establece un vínculo directo** entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización; así como una **relación de colaboración** entre la organización/área ejecutora y la organización/área solicitante.
- En el caso de proyectos externos, generalmente se opta por establecer este **acuerdo a través de un contrato formal.**

7

7

El Acta Constitutiva del proyecto (Project Charter)

- El proyecto se inicia formalmente con la aprobación del Project Charter
- Durante su elaboración se **selecciona al PM**. Éste debe ser elegido antes de comenzar con el proceso de planificación.
- Puede ser desarrollado por el sponsor o PM en colaboración con la entidad iniciadora.
- Dicha colaboración permite al PM comprender mejor el propósito del proyecto, sus objetivos y beneficios esperados**.**
- A grandes rasgos, **asegura una comprensión común** por parte de los interesados sobre: los entregables clave, los hitos y los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto.

8

8

Elementos de un Project Charter

1. **Nombre del Proyecto**: frase corta que permita identificar y saber de qué se trata el proyecto.
2. **Sigla del Proyecto**: código identificador del proyecto. Pocas letras y/o números.
3. **Fecha de Elaboración**: es importante que todos los documentos sean rastreables. Cuando se originaron y cuando se modificaron.
4. **Objetivo de Negocio:** es la meta "medible" hacia la cual se dirigen las operaciones y/o los proyectos de la organización. Pueden ser financieros, de marketing, de ventas etc.
5. **Objetivo del Proyecto**: es la meta "medible" hacia la cual se debe dirigir el trabajo del proyecto, en términos de la triple restricción.
6. **Justificación del Proyecto**: descripción de la razón de ser del proyecto. Responde a la pregunta ¿por qué lo hacemos? Ej. necesidad de la organización, pedido de un cliente, demanda del mercado, nuevo requisito legal o medioambiental, o avance tecnológico. Implica fundamentar de qué manera el proyecto aportará valor.

9

9

Al momento de desarrollar los Objetivos utilizar la metodología:





Objetivo de negocio: *"Aumentar las ganancias económicas de la productora en un 50% en el plazo de 5 años".*

Objetivo del proyecto: *"Producir la primera versión teatral musical de "La la land", llevándola a un teatro de la Calle Corrientes en el plazo de un año".*

10

10

Elementos de un Project Charter

7. **Descripción del Proyecto y los límites**: explicación que conteste las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde? Describe el alcance inicial del proyecto.
8. **Descripción del Producto/Servicio/Resultado del Proyecto**: se describe aquello que se espera obtener con la implementación del proyecto.
9. **Riesgo general del Proyecto**: pueden ser Amenazas u Oportunidades.
10. **Resumen del Cronograma de Hitos**: son los eventos más importantes a lo largo del proyecto, desde el inicio al cierre.
11. **Presupuesto preliminar:** son los recursos financieros preliminares preaprobados.

Elementos de un Project Charter

12. **Lista de Interesados clave (Stakeholders):** son todas las personas u organizaciones que participan en el desarrollo del proyecto o se van a ver afectados por él.
13. **Requisitos de aprobación del proyecto:** en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito y quién firma la aprobación del proyecto.
14. **Criterios de salida del proyecto**: qué condiciones deben cumplirse a fin de cerrar o cancelar el proyecto o fase.
15. **Director del proyecto asignado**, su responsabilidad y su nivel de autoridad (cargo);
16. **Sponsor:** el nombre y el nivel de autoridad de quien o de quienes autorizan el Acta de Constitución del Proyecto.



Desarrollo del TPO

Planificación del Alcance: desarrollo del Project Charter

13

13

Momento de Clase Taller

1) Formarse en equipos de 6 personas c/u.
2) Desarrollar el Acta Constitutiva de un Proyecto vinculado con sus carreras.
3) El documento debe incluir como mínimo:
   - Nombre del proyecto
   - Sigla
   - Fecha de elaboración
   - Objetivo de Negocio
   - Objetivo del Proyecto
   - Justificación del Proyecto
   - Descripción del producto, servicio o resultado del proyecto



14

14

Puesta en Común de los Project Charter

1) Un integrante de cada equipo adoptará el rol del Sponsor del Proyecto y dará a conocer su PC.
2) En base a las correcciones que realicemos en la puesta en común cada equipo ajustará su PC.

15

La Declaración o Enunciado del Alcance (Scope Stament)

- Es la descripción del alcance del proyecto y del producto**.**
- **Describe todo el trabajo que se requiere para ejecutar el proyecto.**
- Brinda una base documentada para la toma de decisiones y para que el equipo de proyecto desarrolle y logren un entendimiento común acerca del alcance de este.
- Define los límites del proyecto. Esto es clave para la posterior toma de decisiones ante la solicitud de cambios o nuevos pedidos.

16

Elementos de un Scope Statement

1. **Nombre del Proyecto**
2. **Sigla del Proyecto**
3. **Fecha de Elaboración** (del SS)

4. **Objetivo de Negocio:** definido por el cliente o el área de la organización que solicita el proyecto.
5. **Objetivo del Proyecto**: definido por el cliente o área de la organización que solicita el proyecto, pero adaptado al alcance acordado con la organización o área que ejecuta el proyecto.

6. **Justificación del Proyecto**: definido previamente por el cliente o el área de la organización que solicita el proyecto.

7. **Descripción del alcance del proyecto**

8. **Descripción del producto, servicio o resultado del proyecto**

17

17

Elementos de un Scope Statement

>> Descripción del alcance del proyecto

Todo el trabajo que se debe realizar para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características acordadas con el cliente o área solicitante.

Incluye todas las actividades, tareas, procesos y entregables que se deben llevar a cabo para cumplir los objetivos del proyecto. Es decir, cómo se logrará desarrollar el producto, servicio o resultado.

En ocasiones se considera que el término “alcance del proyecto” incluye el alcance del producto.

>> Descripción del producto, servicio o resultado del proyecto

Características y funciones únicas y distintivas del producto, servicio o resultado esperado del proyecto. Es decir, cómo debería ser el entregable principal del proyecto (lo que se entregará al final del proyecto).

Describe las especificaciones detalladas, atributos y características que el producto debe tener para satisfacer las necesidades del cliente o usuario.

18

18

Elementos de un Scope Statement

9. **Entregables del proyecto:** son cualquier producto, resultado o capacidad para realizar un servicio que se produce que asegurarán la conclusión exitosa y completa del proyecto.

   Los entregables pueden ser tangibles o intangibles y son fundamentales para definir el alcance del proyecto. Se producen para completar un proceso, una fase o un proyecto.

   Cada entregable debe cumplir con ciertos criterios de aceptación que se definen al inicio del proyecto y son validados al momento de la entrega.

10. **Criterios de aceptación:** condiciones específicas y medibles que un entregable o un resultado del proyecto debe cumplir para ser considerado completo y aceptado por el cliente, sponsor o partes interesadas clave.

    Estos criterios son acordados durante la planificación del proyecto y sirven como una referencia para evaluar si un entregable cumple con las expectativas y requisitos definidos.

19

19

Elementos de un Scope Statement

11. **Restricciones:** variables que limitan el proyecto (costos, presupuestos, fechas, importaciones, necesidades de capacitación, plazos, proveedores, entre otros).

12. **Supuestos:** son factores que, a efectos de planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos sin necesidad de una prueba específica en ese momento. Estos supuestos pueden referirse a cualquier aspecto del proyecto, como recursos disponibles, tiempos de entrega, condiciones del entorno, tecnologías, entre otros.

    Deben revisarse y validarse a lo largo del proyecto, ya que pueden cambiar y evolucionar.

13. **Exclusiones del proyecto:** descripción detallada de aquello que está fuera del alcance del proyecto.

20

20



Desarrollo del TPO

Planificación del Alcance: desarrollo del Scope Statement

21

21

Momento de Clase Taller

1) Los equipos deberán intercambiar el PC realizado previamente.
2) Ahora cada equipo actuará como posible organización ejecutora del proyecto del otro equipo y desarrollará el Scope Statement.
3) El documento debe contener todos los puntos vistos en clase.

¡A trabajar!



22

22

Puesta en Común de los Scope Statement

1) Un integrante de cada equipo adoptará el rol de PM del proyecto y presentará la declaración del alcance, junto con un asistente.
2) En base a las correcciones que realicemos en la puesta en común cada equipo ajustará su SS.

23

23

WBS – Work Breakdown Structures

- En la traducción EDT >> Estructura de Descomposición del Trabajo.
- Organiza y define el alcance total del proyecto. Todo lo que debe gerenciar el PM.
- Es la **descomposición jerárquica del alcance total del trabajo** a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y desarrollar los entregables requeridos.
- Representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente.
- Puede **tomar una amplia variedad de formas**, pero siempre es un desglose jerárquico que **contiene las tareas a realizar agrupadas** según su relación con los productos de cada entregable.
- Diccionario del WBS: documento de apoyo que brinda información sobre los entregables y las actividades correspondientes al proyecto.

24

24

WBS – Work Breakdown Structures

- **Paquete de Trabajo (Work Package):** es un entregable en el último nivel de la estructura del WBS. Puede ser dividido en actividades.
- Es decir que el trabajo planificado está en el nivel más bajo.
- En un Paquete de Trabajo se agrupan actividades relacionadas con los productos o entregables del trabajo. Son resultado de la actividad realizada y no la actividad en sí misma.
- Se puede estimar el costo y la duración por Paquete de Trabajo.

25

25

WBS – Work Breakdown Structures

- Sirve para:
  - ✓ **establecer responsabilidades** de asignación de cada entregable,
  - ✓ **definir estimaciones** de costos y plazos,
  - ✓ **desarrollar la planificación**,
  - ✓ **establecer el cronograma** total como la suma de entregables subdivididos,
  - ✓ **adaptar la estructura de organización** del proyecto a los distintos entregables.

26

26

WBS | Ejemplo



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

27

27

WBS | Ejemplo

Musical Que nos volvamos a ver	Producción	Diseño de Flyers
		Edición de videos para redes
		Edición de video para audiovisuales
	Publicidad Medios Audiovisuales	Comprar espacios en TV
		Comprar espacios en Radio
	Publicidad medios digitales	Gestionar Publicidad en Instagram
		Gestionar Publicidad en Youtube
	Manejo Redes Sociales	Publicaciones en Instagram
		Concurso entradas
		Vivos con la banda

28

28



Desarrollo del TPO

Planificación del Alcance: desarrollo del WBS

Momento de Clase Taller

1) En base a su Scope Statement desarrollar el WBS del proyecto.
2) Tienen 15 minutos para realizarlo.

¡A trabajar!



Puesta en Común del WBS

1) Un integrante de cada equipo presentará el WBS de su proyecto.
2) El otro equipo analizará y dará su devolución sobre si el WBS muestra todo el proyecto completo o no y qué ajustes sería necesario hacer.

39

39

UADE UNA GRAN UNIVERSIDAD

Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash
- Rodriguez, G. (2018), Filminas Gerenciamiento del Alcance.

- Bibliografía: Sexta edición del PMBOK (PMI). Consultar link de descarga en novedades en Webcampus.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2017, 2021).

40

40
