
Dominio de Desempeño del Equipo

Lic. Ornela Palombo

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

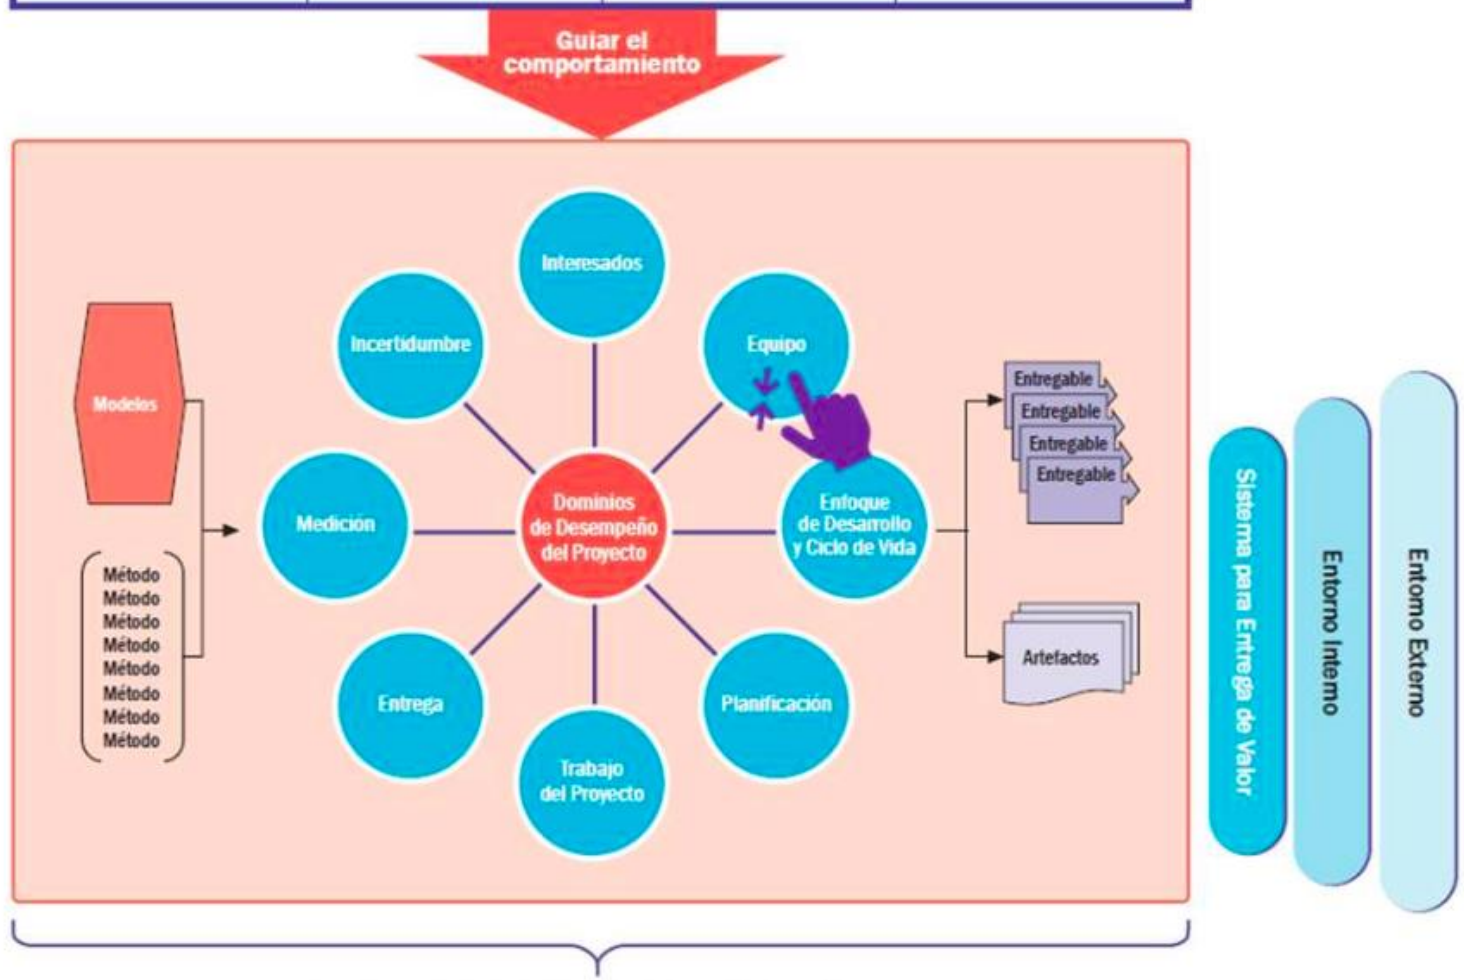

Dominio de Desempeño del Equipo

- Este dominio implica **establecer la cultura y el entorno que permita a un conjunto de diversos individuos evolucionar hasta convertirse en un equipo de proyecto de alto rendimiento.**

- Incluye el reconocimiento de las actividades necesarias para fomentar el desarrollo del equipo y alentar los comportamientos de liderazgo de todos sus miembros.

Interesados clave dentro de este dominio:

- **Director del Proyecto:** persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo del proyecto, siendo responsable de alcanzar los objetivos de este.

- **Equipo de Dirección de Proyecto:** miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de dirección del proyecto.

- **Equipo de Proyecto:** conjunto de individuos que realizan el trabajo del proyecto con el fin de alcanzar sus objetivos

Una distinción importante

- Los **recursos físicos** incluyen el equipamiento, los materiales, las instalaciones y la infraestructura.

    - **Gestión de Recursos Físicos**: se concentra en la asignación y utilización de los recursos físicos (por ejemplo: materiales, equipos y suministros) necesarios para la exitosa finalización del proyecto.

- Los **recursos del equipo o de personal** se refieren a los recursos humanos.

Equipo del proyecto: consiste en individuos que tienen asignados roles y responsabilidades, quienes trabajan en conjunto para lograr un objetivo común del proyecto:

- Pueden tener diferentes conjuntos de habilidades
- Pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial
- Se pueden incorporar o retirar del equipo del proyecto conforme avanza el mismo

(PMBOK, 2017)

Sobre el proceso de adquirir los recursos

- Los **recursos necesarios para el proyecto pueden ser internos o externos** a la organización ejecutante del proyecto.
  - Los **recursos internos** son adquiridos (asignados) por gerentes funcionales o de recursos.
  - Los **recursos externos** son adquiridos a través de los procesos de adquisición.

- **El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control directo sobre la selección de los recursos**, debido a convenios colectivos de trabajo, al uso de personal subcontratado, a un entorno de proyecto de tipo matricial, a las relaciones de comunicación interna o externa, entre otros motivos.

Conceptos clave

- **Actividades de dirección:** Se centran en los medios para cumplir los objetivos del proyecto, como procesos eficaces, planificación, coordinación, medición y supervisión del trabajo

- **Actividades de liderazgo:** Se enfocan en las personas, abarcando influenciar, motivar, escuchar y habilitar al equipo del proyecto.

- **Rol:** La función asumida por o asignada a una persona en el ámbito del proyecto. Ejemplos de roles en un proyecto son el director de arte, sonidista y coordinador de comunicación.

- **Autoridad:** Los derechos de asignar los recursos del proyecto, tomar decisiones, firmar aprobaciones, aceptar entregables e influir sobre otras personas para llevar a cabo el trabajo del proyecto.

- **Responsabilidad:** Las tareas asignadas y el trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto a fin de completar las actividades de este.

- **Competencia**: La habilidad y los conocimientos requeridos para completar las actividades asignadas dentro de las restricciones del proyecto.

Artefactos clave en el Dominio de Desempeño del Equipo

Organigrama del Proyecto

- Es la representación gráfica de los miembros del equipo del proyecto y de sus relaciones de comunicación.
- Dependiendo de las necesidades del proyecto, puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera general.
- Solo muestra a los integrantes del proyecto.

Artefactos clave en el Dominio de Desempeño del Equipo

Matriz RACIS

- Es un tipo de Matriz de Asignación de Responsabilidades
- Es una herramienta útil **para garantizar una asignación clara de funciones y responsabilidades** cuando el equipo está compuesto de recursos internos y externos.

R = Responsible → persona responsable de ejecutar la tarea

A = Accountable → persona con responsabilidad última sobre la tarea

C = Consult → persona a la que se consulta sobre la tarea

I = Inform → persona a la que se debe informar sobre la tarea

S = Sign → persona que debe firmar documentación relacionada con la tarea

Artefactos clave en el Dominio de Desempeño del Equipo

Matriz RACIS

Roles	A	B	C	D	E	F	…
Tareas							
Requerimientos	S	R	A				
Funcionamiento	S		A				
Diseño	S		R	A	I		
Desarrollo		R	S	A		C	
Ensayos			S	C	I	A	

R: Responsable
A: Accountable
C: Consult
I: Inform
S: Sign

Artefactos clave en el Dominio de Desempeño del Equipo

La siguiente Matriz RACIS ¿esta correctamente desarrollada? SI/NO ¿Por qué?

Matriz de roles y responsabilidades	Roles		
Tareas	Director Mkt	Analista Mkt	Desarrollador web
Definir el presupuesto total	A,S	R	C
Generar el contenido del sitio	A	R	I
Contactar al diseñador para el armado de piezas gráficas	I	R, A	
Programación de key words		C	R, A
Controlar y aprobar la página web a ser lanzada	A	R	I

Artefactos clave en el Dominio de Desempeño del Equipo

La siguiente Matriz RACIS ¿esta correctamente desarrollada? SI/NO ¿Por qué?

Roles / Tareas	Stakeholders	Organizador de Evento	Project Manager	Ejecutivo de Producción
Armado de Perfil de Locación	S	A	R	S
Contratar Salón	-	A	I	-
Pago	I	R	-	-
Definir Puesta en Escena	-	R	I	R
Decidir tipo y partes de escenografía a utilizar	-	I	-	R
Armado y ubicación de las partes	-		-	R
Decorado	-	R	-	I
Listado de Canciones a reproducir	-	R	-	I
Entrevista con DJ	-	I	C	I
Solicitud de equipo de Audio	-	I	-	R
Selección de Pantalla LED y Proyector	-	R	I	I
Montaje de Pantalla LED y Proyector	-	I	-	R
Prueba de Pantalla LED y Proyector	-	R	-	I
Planificación del Iluminado General	-	C	I	R
Supervisar señalización de Salidas de Emergencia	-	-	-	R
Planificación de Iluminado al Escenario	-	R	-	-



Desarrollo del TPO

Dominio de Desempeño del Equipo: desarrollo de organigrama y de la matriz RACIS

Momento de Clase Taller

1) Desarrollar el organigrama de su proyecto.

2) Desarrollar la matriz RACIS analizando las 10 tareas principales y los roles clave para su desarrollo.

¡A trabajar!



Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash
- Rodriguez, G. (2013), Filminas Gerenciamiento de los Recursos

- Bibliografía: Sexta edición del PMBOK (PMI). Consultar link de descarga en novedades en Webcampus.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2017, 2021).
