
Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto

ADQUISICIONES

Lic. Ornela Palombo

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

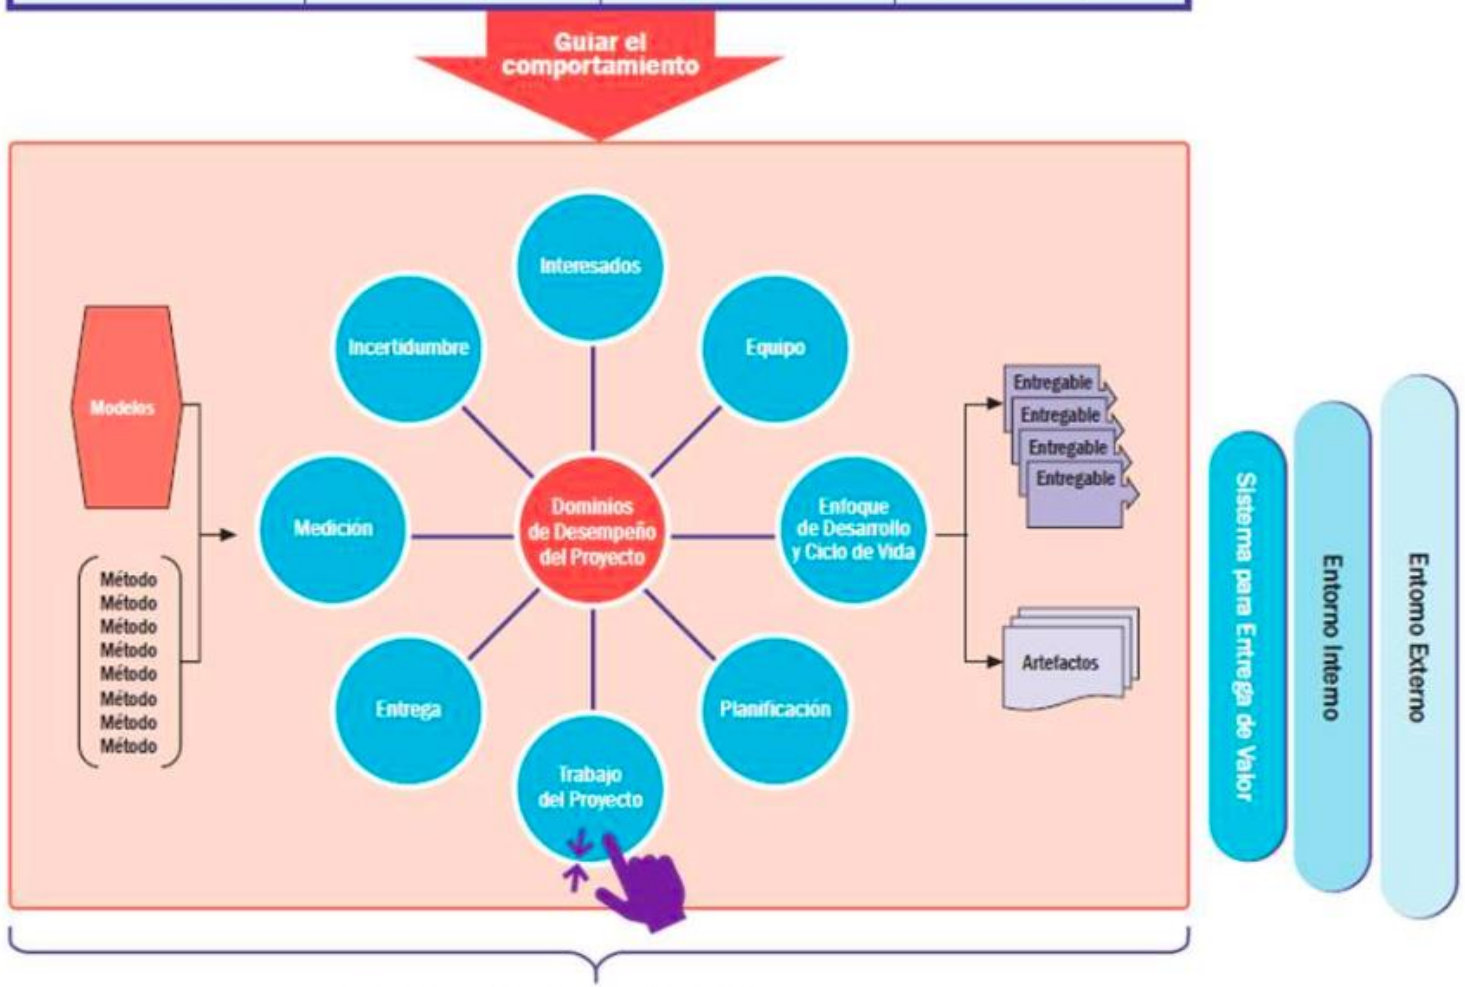

Sobre las Adquisiciones

- Una adquisición se refiere a la compra de bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante.
- La planificación inicial de las adquisiciones ayuda a establecer expectativas y asegura que el proceso se lleve a cabo sin problemas.
- Pueden abarcar desde materiales, equipos de capital y suministros, hasta soluciones, mano de obra y servicios
- En el caso de **organizaciones más pequeñas o empresas de reciente creación** y aquellas que carecen de un departamento de compras **el DP puede asumir el papel de autorizador de compras para negociar y firmar contratos directamente** (compras descentralizadas).
- En el caso de **organizaciones más maduras, las funciones concretas de adquisición y contratación serán llevadas a cabo por un departamento** separado con el rol específico de comprar, negociar y firmar contratos (compras centralizadas).

(PMBOK, 2017; 2021)

Sobre las Adquisiciones

- La mayoría de las organizaciones **cuenta con políticas y procedimientos documentados** que definen específicamente **reglas de adquisición**, así como **quien esta autorizado a firmar y administrar dichos acuerdos** en nombre de la organización.

- En todo el mundo, las organizaciones utilizan diferentes nombres para los departamentos o divisiones que se ocupan de las adquisiciones, tales como **compras, contrataciones o simplemente adquisiciones**; sin embargo, las responsabilidades suelen ser similares.

(PMBOK, 2017)

Proceso de Adquisición

Planificación Inicial de las Adquisiciones	**Decisión de hacer o comprar:** implica la evaluación de los entregables y servicios para determinar cuáles se desarrollarán internamente y cuáles se comprarán de fuentes externas. Esta decisión tiene un impacto directo en el equipo del proyecto y en el cronograma
Proceso de Licitaciones	El director del proyecto y los miembros del equipo técnicamente calificados colaboran con los profesionales de contratación para desarrollar los **documentos de licitación. Esto es elaborar** las especificaciones y pliegos para aquello que se decida comprar.
Selección de Contratistas	Se evalúan las ofertas y una vez que se llega a un acuerdo, se formaliza el contrato. El **tipo de contrato** se elige según el tamaño de la compra, la estabilidad del alcance y la tolerancia al riesgo de las organizaciones.
Administración de Contratos	Asegurar la provisión del trabajo contratado.
Cierre del Contrato	Cierre formal

(Rodríguez, 2013; PMBOK, 2017)

Conceptos clave vinculados a comprar

SOW – ENUNCIADO DE TRABAJO:

- Es un documento que contiene una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que deben ser entregados por el proyecto.
- El **enunciado del trabajo (SOW) para cada adquisición se elabora a partir de la línea base del alcance del proyecto** y sólo define la parte del alcance del proyecto que se incluirá dentro del contrato en cuestión.
- El **SOW describe el artículo que se planea adquirir con suficiente detalle como para permitir que los posibles vendedores determinen si están en condiciones de proporcionar** los productos, servicios o resultados requeridos.
- El **nivel de detalle necesario puede variar** en función de la naturaleza del artículo, las necesidades del comprador o la forma del contrato previsto.
- La información recogida en un SOW puede incluir especificaciones, cantidad deseada, niveles de calidad, datos de desempeño, período de desempeño, lugar de trabajo y otros requisitos

(PMBOK, 2017)

Conceptos clave vinculados a comprar

- **El SOW relativo a las adquisiciones debe ser claro, completo y conciso.**
- Incluye una descripción de los servicios adicionales requeridos, tales como informar el desempeño o el soporte operativo para el artículo adquirido después de finalizado el proyecto.
- El SOW puede ser revisado según sea necesario, a medida que avanza a través del proceso de adquisición hasta que se incorpora a un acuerdo firmado.

(PMBOK, 2017)

Conceptos clave sobre Licitaciones

- Planificar las licitaciones implica elaborar la documentación necesaria para llevar adelante los procesos de licitación, concursos o invitaciones a cotiza y/o negociar.

- **Estos documentos facilitan al comprador recibir las propuestas u ofertas ajustadas a satisfacer su necesidad desde varios proveedores potenciales.**

- La **homogenización de las respuestas** facilitará al comprador la comparación de las distintas propuestas tanto en alcance, en precios como en condiciones contractuales.

- **Documentos de Licitación**: se utilizan muchos términos de manera intercambiable y se debe tenerse cuidado de no hacer suposiciones. Éstos son:

  - **Solicitud de Información (RFI):** Se emplea para recopilar más información del mercado antes de enviar los documentos de licitación a proveedores seleccionados.

  - **Solicitud de Propuesta (RFP)**: Se utiliza cuando el alcance es complejo o complicado y el comprador busca una solución del proveedor.

  - **Solicitud de Cotización (RFQ):** Se emplea cuando el precio es el principal factor decisivo y la solución propuesta está fácilmente disponible

(Rodríguez, 2013)

Conceptos clave Contratos

- Un contrato debe establecer claramente los **entregables y los resultados esperados**, incluida cualquier **transferencia de conocimiento** del vendedor al comprador.
- Un **contrato de compra incluye términos y condiciones** y puede incorporar otros detalles del comprador respecto a lo que el vendedor debe realizar o proporcionar.
- Todo aquello que no esté en el contrato no puede exigirse legalmente.
- Cuando se trabaja a nivel internacional, **los DP deben considerar cómo la cultura y las leyes locales influyen sobre los contratos y su capacidad de ser cumplidos**, independientemente de lo bien que esté redactado el contrato.
- Es responsabilidad del equipo de dirección del proyecto **garantizar que todas las adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del proyecto,** a la vez que trabaja con la oficina de adquisiciones para **asegurar que se sigan las políticas de la organización** en materia de adquisiciones.

(PMBOK, 2017)

Conceptos clave sobre los Procesos de Controlar las Adquisiciones

- Tanto el comprador como el vendedor administran el contrato de adquisición con finalidades similares.
- **Cada uno de ellos debe asegurar que ambas partes cumplan con sus respectivas obligaciones contractuales y que sus propios derechos legales se encuentren protegidos**.

- La calidad de los controles, incluida la independencia y credibilidad de las auditorías de la adquisición, resulta crítica para la confiabilidad del sistema de adquisiciones.

- El código de ética de la organización, su asesor jurídico y los acuerdos de asesoramiento legal externo, incluida cualquier iniciativa anticorrupción en curso, pueden contribuir a un control adecuado de las adquisiciones.

(PMBOK, 2017)

Conceptos clave sobre los Procesos de Controlar las Adquisiciones

- **El proceso Controlar las Adquisiciones tiene un componente de gestión financiera que implica el monitoreo de los pagos al vendedor**.

- Esto asegura que se cumplan las condiciones de pago definidas en el contrato y que la retribución se corresponda con el avance del vendedor, según lo establecido en el contrato.

(PMBOK, 2017)

Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash
- Rodriguez, G. (2013), Filminas Gerenciamiento de la calidad

- Bibliografía: Sexta edición del PMBOK (PMI). Consultar link de descarga en novedades en Webcampus.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2017, 2021).
